

Appendiks

Retningslinjer

Alle igangværende statslige it-projekter¹ med projektudgifter på 10 mio. kr. eller derover indberetter halvårligt deres status til Statens It-råd.

Særligt tre målbare parametre er interessante i denne sammenhæng: Forventede projektudgifter, tidsplan og projektets økonomiske rentabilitet (her angivet ved nettonutidsværdien²). Disse tre parametre vurderes for hvert enkelt projekt på baggrund af nedenstående kriterier.

PROJEKTUDGIFTER		forventes overskredet mere end 10 pct. eller 6 mio. kr. ift. baseline.
		forventes overskredet op til 10 pct. eller 6 mio. kr. ift. baseline.
		forventes ingen overskridelser.
TIDSPLAN		forventes forsinket mere end 3 måneder ift. baseline.
		forventes forsinket 1 til 3 måneder ift. baseline.
		forventes forsinket højst 1 måned ift. baseline.
NETTONUTIDSVÆRDI		forventes at blive mindre end 90 pct. af baseline.
		forventes at blive 90-95 pct. af baseline.
		forventes at blive mindst 95 pct. af baseline.

I forlængelse af disse tre parametre præsenterer appendikset også to andre parametre som indgår i den samlede vurdering af hvert enkelt projekt. De to parametre er projektets bruttogevinster og ikke-økonomiske gevinster.

Alle indberettede beløb, inklusiv baseline, er justeret til 2018-priser. Det understreges, at den samlede status for projektet er en helhedsvurdering fra Statens It-råd, der bygger på flere faktorer end ovennævnte.


Alle informationer om projekterne i dette appendiks er videregivet som indberettet af myndighederne.

¹ Ved fortrolige projekter fremgår kun nogle af de økonomiske nøgletal i appendikset.


² Nettonutidsværdien er beregnet som nutidsværdien af de økonomiske gevinster fratrukket projektudgifterne. Nutidsværdien af fremtidige udgifter og økonomiske gevinster beregnes ved at diskontere med 4 pct. pr. år, hvilket er fastsat af Finansministeriet. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi større end 0.

Læsevejledning

Projektudgifter og nettonutidsværdi

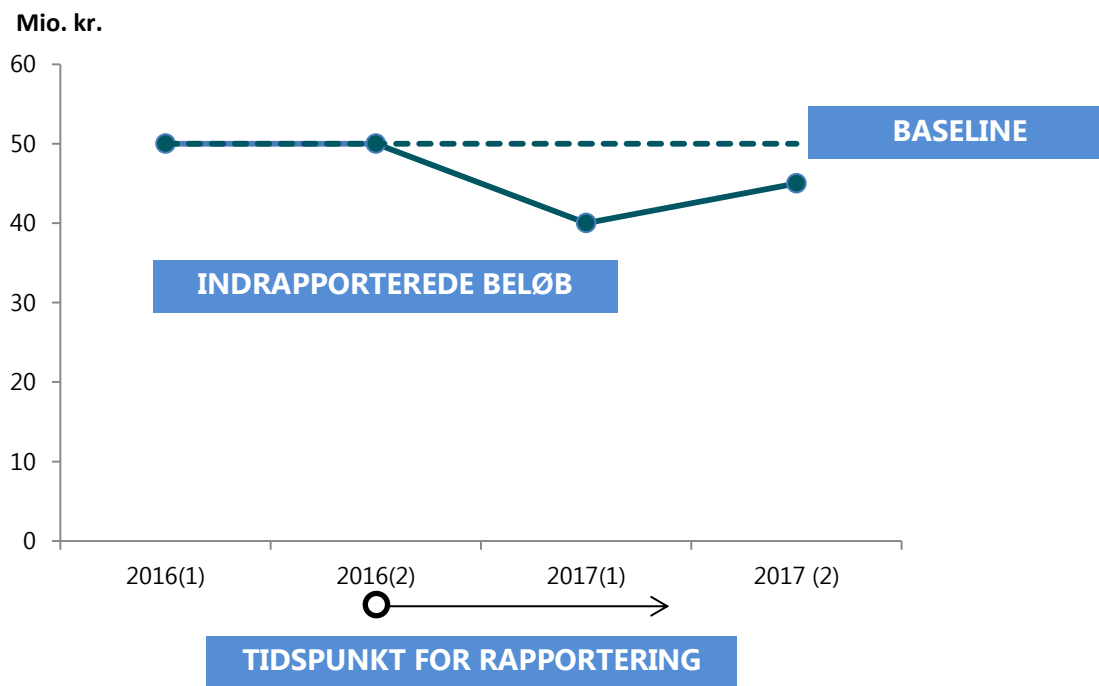


Projektafslutning

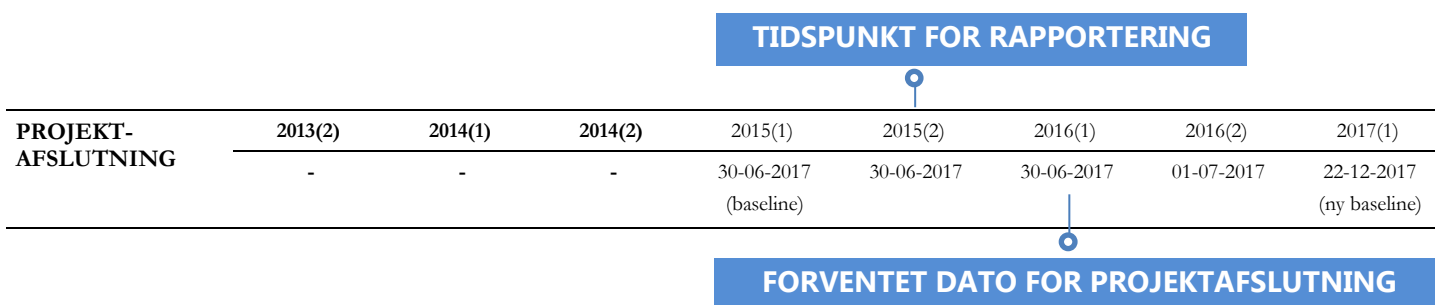


PROJEKTETS NAVN	Atrium	
SAMLET TRAFIKLYS		
MYNDIGHED	Bygningsstyrelsen, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet	
PROJEKTETS FORMÅL	Kvalitetsløft	
BESKRIVELSE	Projektet skal skabe kvalitetsløft ved implementering af fem moduler i det modulopbyggede it-system til ejendomsadministration, Atrium. Projektet skal skabe sammenhæng i Bygningsstyrelsens samlede opgaveportefølje og understøtte en moderne, funktionel og omkostningseffektiv drift og vedligehold af Bygningsstyrelsens samlede ejendomsdispositioner.	
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse	
PROJEKTUDGIFTER	58,0 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	7,6 mio. kr.	
PROJEKTAFLUTNING	1. januar 2020	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	
NETTONUTIDSVÆRDI	3,7 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	-5,7 mio. kr.	
BRUTTOGEVINSTER	73,5 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.	

PROJEKTETS NAVN **Atrium**

PROJEKTUDGIFTER

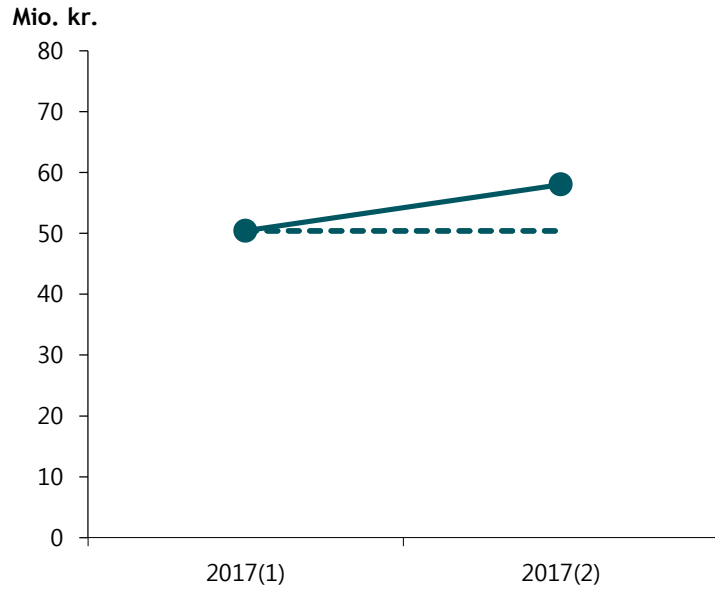

NETTONUTIDSVÆRDI

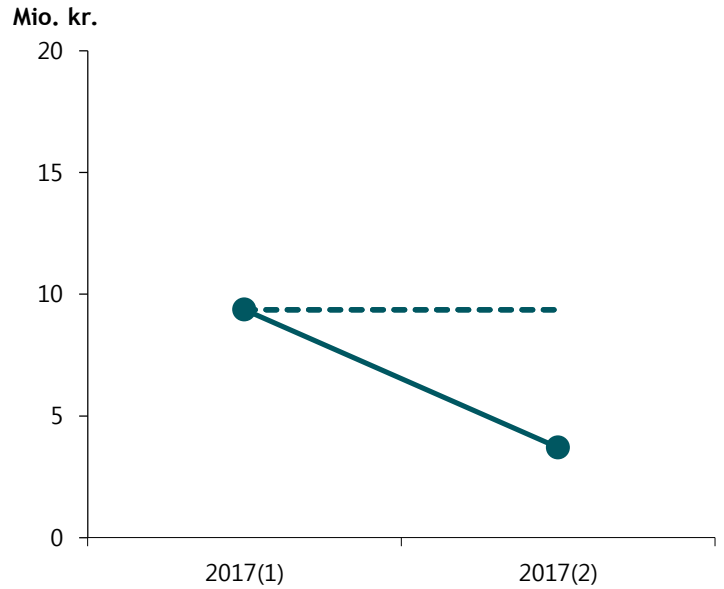

	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
PROJEKT-AFSLUTNING	-	-	-	-	-	-	01-01-2020 (baseline)	01-01-2020
HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	-	-	-	-	-	-	■	■

PROJEKTETS NAVN

CBC (Country by Country)

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

SKAT, Skatteministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivningsprojekt

BESKRIVELSE

Projektet etablerer en løsning, der gør at de multinationale koncerner kan overholde deres pligt til at indberette "land for land-rapporter", udveksle "land for land-rapporter" med OECD/EU og USA, samt udstille data til rådighed for indsatsarbejdet i SKAT.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

39,9 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen



PROJEKTAFLUTNING

15. februar 2019

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

-38,2 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



BRUTTOGEVINSTER

Projektet har ingen økonomiske gevinster

AFGIVELSE IFT. BASELINE

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS
NAVN

CBC (Country by Country)


PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

Mio. kr.

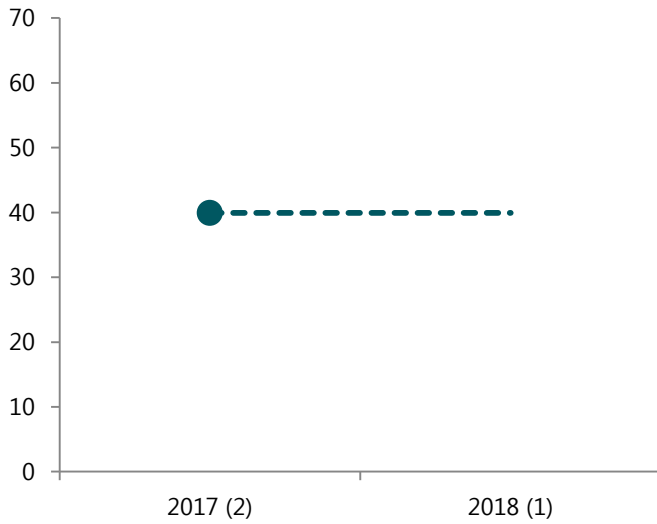

Mio. kr.

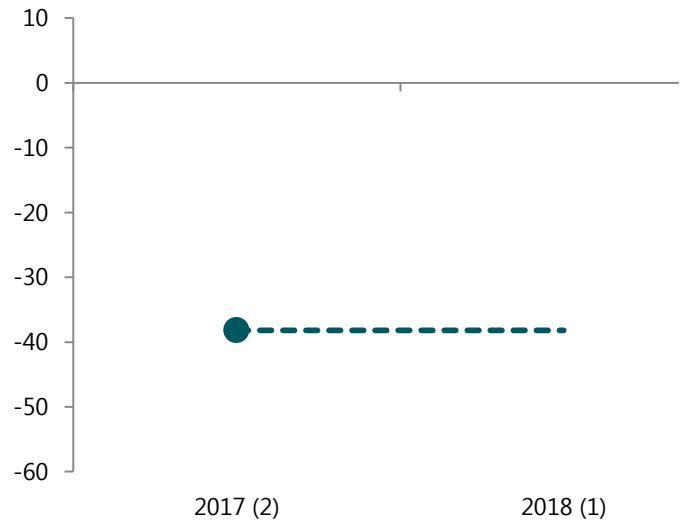

	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
PROJEKT- AFSLUTNING	-	-	-	-	-	-	-	15-02-2019 (baseline)
HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	-	-	-	-	-	-	-	■

PROJEKTETS NAVN

Domsdatabasen

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivning

BESKRIVELSE

Projektets primære formål er knyttet til et politisk ønske om, at der skal etableres en offentligt tilgængelig digital domsdatabase (Domsdatabasen). Der er på denne baggrund vedtaget en lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter af 15. december 2015. Formålet med Domsdatabasen er at tilgodese det grundlæggende princip om offentlighed i retsplejen ved at gøre domme offentligt tilgængelige for enhver i en digital database. Der etableres med Domsdatabasen en gratis adgang for såvel private som erhvervsdrivende og offentlige myndigheder til domme fra Danmarks Domstole med henblik på såvel privat som kommerciel og forskningsmæssig brug af de offentliggjorte domme.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbudIngen 

PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud7 måneder 

NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE





Fortroligt pga. udbudIngen 

BRUTTOGEVINSTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE


Projektet har ingen økonomiske gevinsterIKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har fem ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS NAVN	EESSI	
SAMLET TRAFIKLYS		
MYNDIGHED	Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet	
PROJEKTETS FORMÅL	Lovgivning	
BESKRIVELSE	Projektet er en del af EESSI programmet, som foruden knudepunkt og gateway omfatter sagshåndteringssystemet RINA samt fire lokale tilkoblingsprojekter. Projektet EESSI har til formål at etablere et nationalt knudepunkt og tilhørende gateway til udveksling af sociale data mellem sociale sikringsinstitutioner i EU i en standardiseret form. Herudover skal projektet etablere en solid infrastruktur, som sætter danske institutioner i stand til at varetage sagsforvaltning af vandrende arbejdstagere korrekt og bidrage til den tværoffentlige indsats for kontrol af sociale ydelser.	
NUVÆRENDE FASE	Anskaffelse	
PROJEKTUDGIFTER	18,0 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	
PROJEKTAFLUTNING	1. juli 2019	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	
NETTONUTIDSVÆRDI	-41,2 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	
BRUTTOGEVINSTER	-28,5 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster.	

PROJEKTETS NAVN **EESSI**



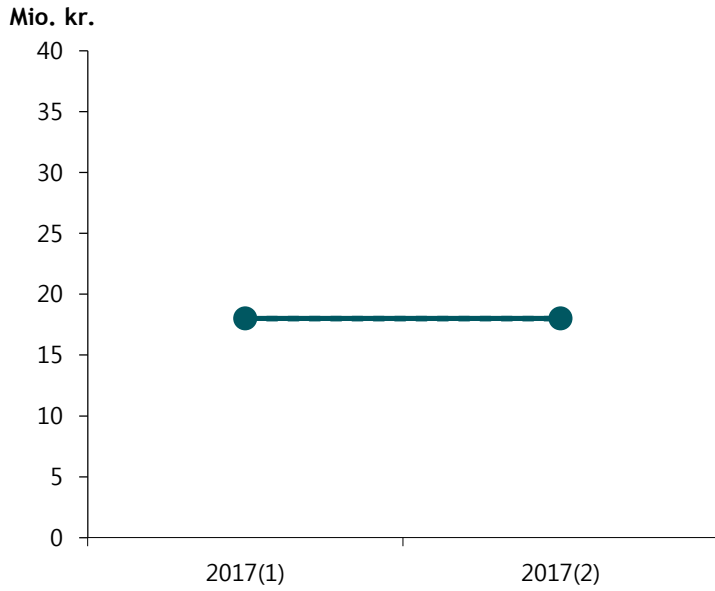

PROJEKTUDGIFTER

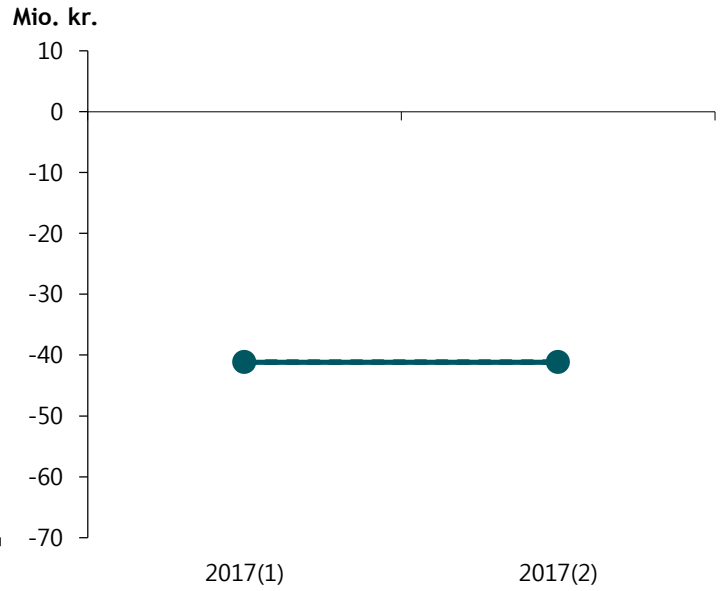

NETTONUTIDSVÆRDI



	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
PROJEKT-AFSLUTNING	-	-	-	-	-	-	01-07-2019 (baseline)	01-07-2019
HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	-	-	-	-	-	-	■	■



PROJEKTETS NAVN	eKapital	
SAMLET TRAFIKLYS		
MYNDIGHED	SKAT, Skatteministeriet	
PROJEKTETS FORMÅL	Lovgivning	
BESKRIVELSE	Projektet har to primære formål: 1) implementering af to aftaler om international udveksling af skatteoplysninger i systemer og processer på eKapitalområdet og 2) omlægning og modernisering af systemer og processer vedrørende indberetning af renteoplysninger fra den finansielle sektor til SKAT som følge af skattereformen fra 2012. Det sekundære formål er at tilvejebringe en ny teknisk platform på eKapitalområdet.	
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse	
PROJEKTUDGIFTER	130,0 mio. kr.	
AFGIVELSE IFT. BASELINE	Ingen	
PROJEKTAFLUTNING	30. juni 2018	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	2,5 måneder	
NETTONUTIDSVÆRDI	-110,7 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	
BRUTTOGEVINSTER	-1,5 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt ud.	

PROJEKTETS
NAVN

eKapital

PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

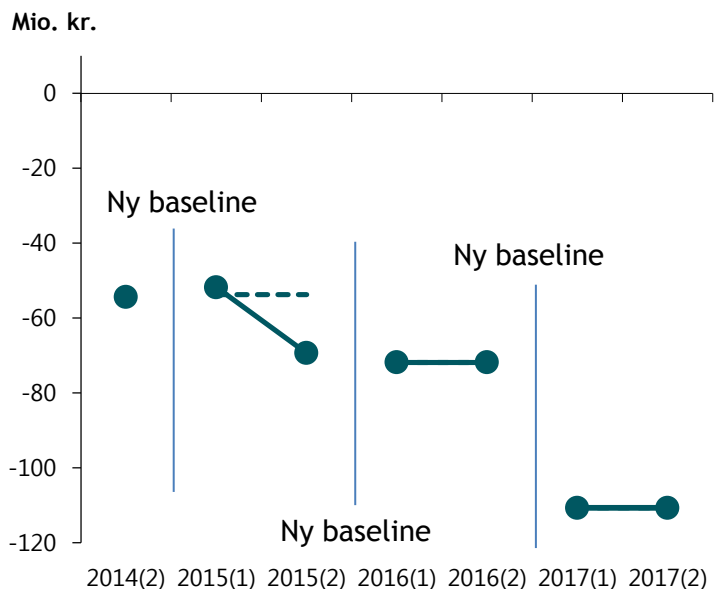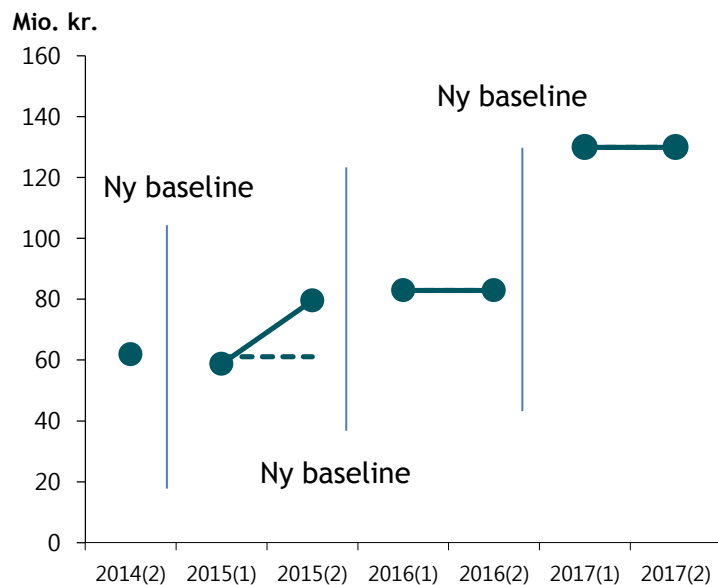

PROJEKT- AFSLUTNING	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	-	01-03-2017 (baseline)	01-03-2017	01-03-2017	01-06-2017 (ny baseline)	01-06-2017	16-04-2018 (ny baseline)	30-06-2018

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	-	■	■	■	■ (ny baseline)	■	■ (ny baseline)	■

PROJEKTETS NAVN

Fællesstatsligt Budgetsystem

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet skal skabe et fællesstatsligt system til at varetage opgaver omkring budgetlægning og -opfølgning i alle statslige institutioner. Derudover skal systemet understøtte ministeriernes koncernstyring. Projektet vil omhandle anskaffelse af et standardsystem samt konsulentassistance til at foretage tilpasninger af pågældende standardsystem samt at understøtte en implementering i alle statens institutioner.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

84,9 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

25. marts 2020

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

20,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

BRUTTOGEVINSTER

131,8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER



Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS
NAVN

Fællesstatsligt Budgetsystem

PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

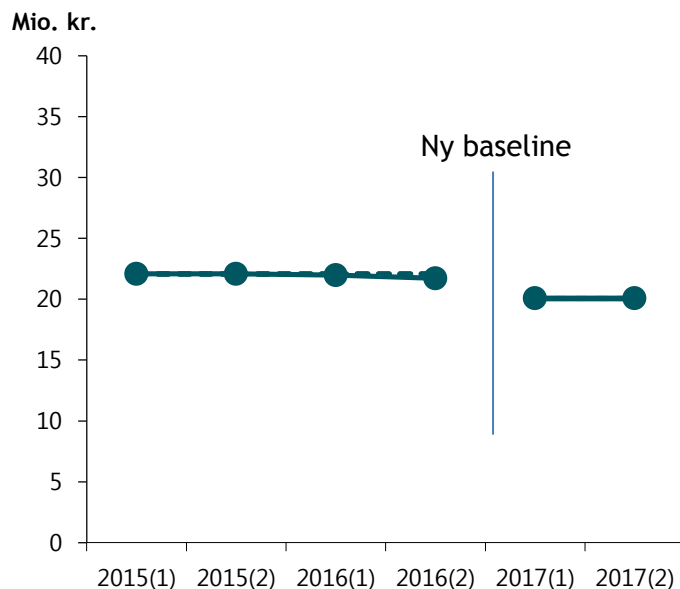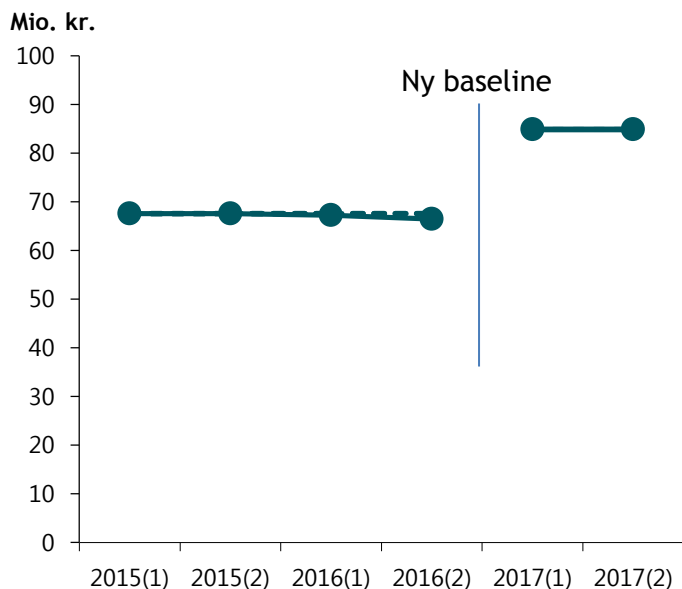

PROJEKT- AFSLUTNING	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	-	-	01-08-2019 (baseline)	01-08-2019	01-08-2019	01-08-2019	25-03-2020 (ny baseline)	25-03-2020

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	-	-	■	■	■	■	■ (ny baseline)	■

PROGRAMMETS NAVN

Grunddataprogrammet

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet

PROGRAMMETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

Regeringen og KL besluttede i oktober 2012 at etablere Grunddataprogrammet med henblik på at forbedre de offentlige grunddataregistre og give private aktører fri adgang til grunddata om ejendomme, adresser, vand, klima, geografi, virksomheder og personer.

I 2013 tilsluttede Danske Regioner sig aftalen. Formålet med Grunddataprogrammet er at sikre en effektiv anvendelse af offentlige grunddata gennem forbedret kvalitet, fri adgang og fælles distribution af data. Bedre anvendelse af de offentlige myndigheders data er en vej til betydelige effektiviseringer i det offentlige og til serviceforbedringer til borgere og virksomheder.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROGRAMUDGIFTER

594,8 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

-25,8 mio. kr. ■

PROGRAMAFSLUTNING

Se delprogrammets tidsplan på næste side ■

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen ■

NETTONUTIDSVÆRDI

4.956,2 mio. kr. ■

AFVIGELSE IFT. BASELINE

30,7 mio. kr.

BRUTTOGEVINSTER

7.663,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

11,8 mio. kr.


IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Grunddataprogrammet har seks ikke-økonomiske gevinster.


PROGRAMMETS
NAVN

Grunddataprogrammet


PROGRAMUDGIFTER

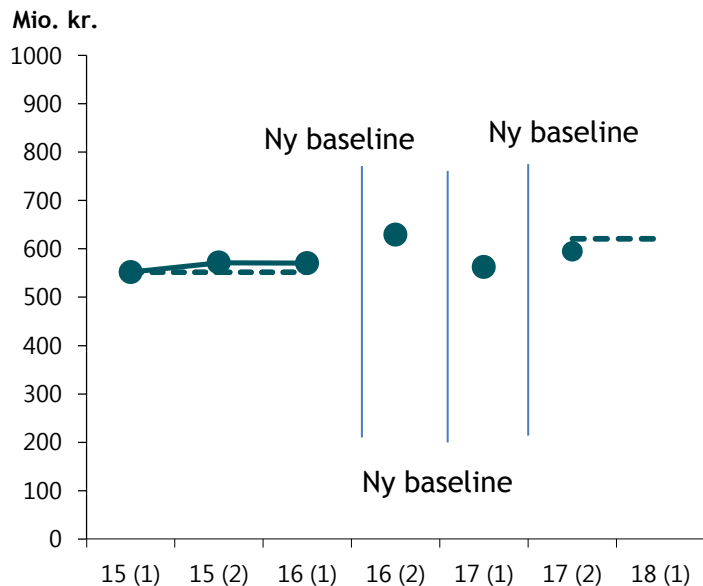

NETTONUTIDSVÆRDI

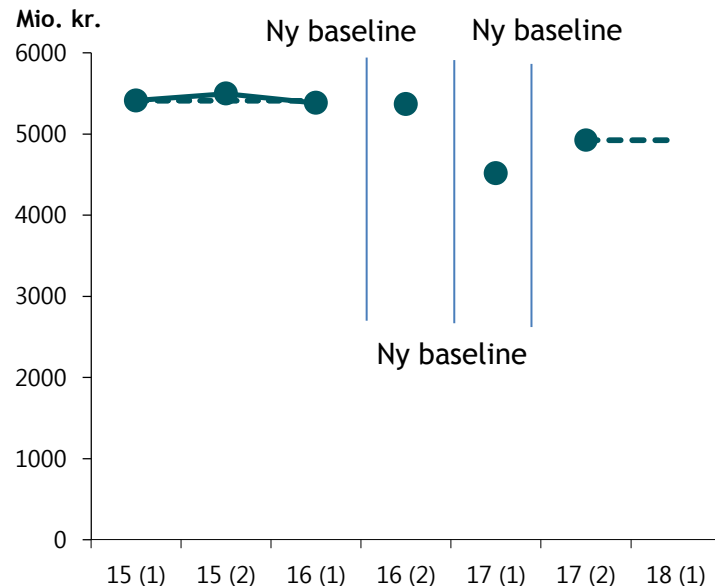

HISTORISKE
SAMLEDE
TRAFIKLYS



START- OG SLUTTIDSPUNKT FOR DELPROGRAMMER

DELPROGRAM	START	SLUT
GD1: Ejendomsdata	31-12-2012	01-06-2019
GD2: Adressedata	31-12-2012	01-07-2018
GD3: Vand- og klimadata	Afsluttet	
GD4: Geodata	Afsluttet	
GD5: Persondata	01-01-2015	01-07-2018
GD6: Virksomhedsdata	31-12-2012	01-07-2018
GD7: Datafordeler	31-12-2012	01-06-2019
GD8: It-arkitektur	Afsluttet	

SPECIFICERET STATUS PR. DELPROGRAM

DELPROGRAM	TID	SCOPE	RESSOURCER	SAMLET STATUS
GD1: Ejendomsdata	■	■	■	■
GD2: Adressedata	■	■	■	■
GD3: Vand- og klimadata	Afsluttet			
GD4: Geodata	Afsluttet			
GD5: Persondata	■	■	■	■
GD6: Virksomhedsdata	■	■	■	■
GD7: Datafordeler	■	■	■	■
GD8: It-arkitektur	Afsluttet			

PROJEKTETS NAVN

GUL (Generel Udstillings Løsning)

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

SKAT, Skatteministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektets mål er, at etablere en generel dataudstillingsløsning i SKAT til en række forskellige lovhjemlede formål, der på tværs af sagsbehandlingssituationer håndhæver logning, adgangsstyring, aftalestyring og datafiltrering.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbudIngen 

PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbudIngen 

NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbudIngen 

BRUTTOGEVINSTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud

Ingen

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som begge forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN

HR-projektet

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet skal anskaffe et fællesstatsligt system til at understøtte HR-opgaverne indenfor områderne personaleadministration og organisationsstyring. Projektet fokuserer på anskaffelse af et standardsystem samt konsulentassistance til at foretage væsentlige tilpasninger og udvidelser af pågældende standardsystem og implementere det i statens institutioner.

Projektet understøtter Moderniseringsstyrelsens strategiske pejlemærker om 1) at levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse samt 2) at skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen af den offentlige sektor. Dette sker ved at lukke det systemmæssige hul på HR-området samt sikre system- og datasammenhæng mellem HR- og øvrige fællesstatslige systemer. Desuden sikrer projektet, at mængden, kvaliteten og aktualiteten af HR-data til rapporterings- og analyseformål forbedres. Det forbedrede datagrundlag og datasammenhæng er en forudsætning for at understøtte forretningsmæssige behov vedrørende analyse, rapportering og benchmarks, og dermed effektiv styring både på lokalt, koncern og centralt niveau.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

92,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

31. august 2020

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

11,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

BRUTTOGEVINSTER

121,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen


IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som begge forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS
NAVN

HR-projektet

PROJEKTUDGIFTER

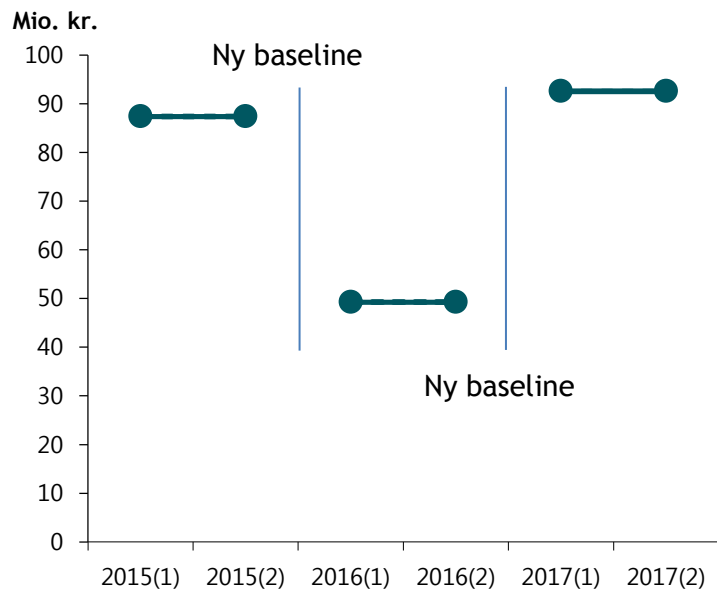

NETTONUTIDSVÆRDI

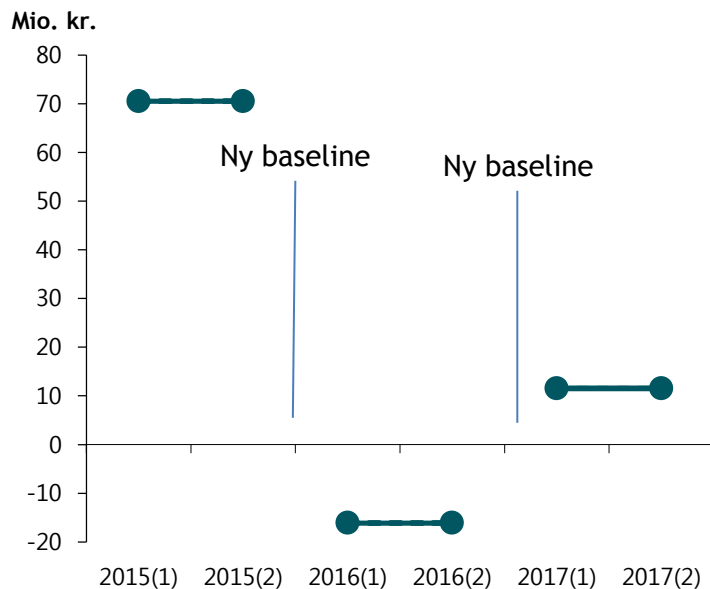

PROJEKT- AFSLUTNING	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	-	-	01-04-2019 (baseline)	01-04-2019	30-06-2019 (replanlagt)	31-08-2019	31-08-2020 (ny baseline)	31-08-2020

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	-	-	■	■	☰ (replanlagt)	■	☰ (nyt aktstykke)	■

PROJEKTETS NAVN

IAM (Identity Asset Management)

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Rigspolitiet, Justitsministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektets formål er at øge kvaliteten i Rigspolitiets brugerstyring for at sikre compliance i den videre og stigende digitalisering af Rigspolitiet med dertilhørende effektiviseringsgevinster. Udover at anskaffe et nyt system til brugerhåndtering ønsker Rigspolitiet at løfte kvaliteten ved at standardisere jobprofiler (roller og rettigheder).

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt pga. udbud

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

Fortroligt pga. udbud

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

Fortroligt pga. udbud

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

BRUTTOGEVINSTER

Fortroligt pga. udbud

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN	Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE)
SAMLET TRAFIKLYS	Intet trafiklys
MYNDIGHED	Skatteministeriet
PROJEKTETS FORMÅL	ICE er i oktober 2014 etableret som en særskilt organisation i Skatteministeriets departement og har til formål at udvikle og implementere et nyt ejendomsvurderingssystem bl.a. med udgangspunkt i anbefalingerne fra Engbergudvalget.
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse
SKATTEMINISTERIETS STATUS	<p>Projektet har fulgt den tidsplan, som er angivet i akt. 132 af 23. juni 2016, og det budget, som er angivet i akt. 111 af 2. marts 2017, og overordnet set er der fremdrift i det samlede program.</p> <p>Arbejdet med at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem må som følge af sin stramme tidsplan, mange afhængigheder og eksterne snitflader fortsat karakteriseres som et højrisikoprojekt, der inden for det kommende år skal tilvejebringe væsentlige hovedleverancer i programmet. Risikoen for forsinkelser i det samlede arbejde kan dermed heller ikke udelukkes.</p> <p>Som følge af de politiske aftaler om <i>Forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem og Tryghed for boligbeskatningen</i> samt Folketingets vedtagelse af den nye ejendomsvurderingslov den 2. juni 2017 er rammerne for udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem dog nu på plads.</p> <p>På den baggrund har ImplementeringsCenter for Ejendomsvurdering gennemført en produktnedbrydning og er på nuværende tidspunkt i gang med at konsolidere såvel de samlede udgifter til udviklingen af systemet som tidsplanen herfor, blandt andet af hensyn til programmet samlede, høje risikoprofil. Resultatet af konsolideringen og de afledte konsekvenser i den forbindelse forudsætter endelig politisk godkendelse.</p> <p>Efter politisk godkendelse heraf vil ImplementeringsCenter for Ejendomsvurdering endeligt færdiggøre det udkast til business case, som tidligere er drøftet med Statens It-projektråd. Det betyder også, at det i forbindelse med statusrapporteringen for 1. halvår 2018 i august 2018 forventes at ville være muligt at statusrapportere til Statens It-projektråds halvårsstatus som de øvrige it-projekter i staten.</p>

PROJEKTETS NAVN

Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI)

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Skatteministeriet

BESKRIVELSE

Formålet for ICI er at tilvejebringe en midlertidig it-understøttelse til inddrivelsesområdet i SKAT, såvel som en langsigtet løsning til ibrugtagning i 2019. Hertil skal ICI understøtte nedlukningen af EFI/DMI i samarbejde med SKAT Inddrivelse, understøtte datavask af fordringer samt bidrage til at forenkle inddrivelseslovgivningen. ICI organiseres i en programstruktur og er under opbygning i Skatteministeriets departement på baggrund af erfaringerne fra Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE).

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

BRUTTOGEVINSTER





Fortroligt

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som begge forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN	It-understøttelse af plandata til ejendomsvurdering (PLP-00)
SAMLET TRAFIKLYS	
MYNDIGHED	Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet
PROJEKTETS FORMÅL	Lovgivning
BESKRIVELSE	Der anskaffes en it-løsning til registrering og udstilling af oplysninger om anvendelses- og udnyttelsesmuligheder jf. plangrundlag (lokalplaner, kommuneplanrammer og landzonetilladelser), vejledede fortolket og registreret på jordstykniveau, og udstillet til offentligheden og til brug for ejendomsvurderingen i Skatteministeriet.
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse
PROJEKTUDGIFTER	35,6 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
PROJEKTAFLUTNING	31. marts 2018
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Færdig 1 dag før tid 
NETTONUTIDSVÆRDI	-35 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
BRUTTOGEVINSTER	Projektet har ingen økonomiske gevinster
AFVIGELSE IFT. BASELINE	
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster.


PROJEKTETS
NAVN

It-understøttelse af plandata til ejendomsvurdering (PLP-00)


PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

Mio. kr.

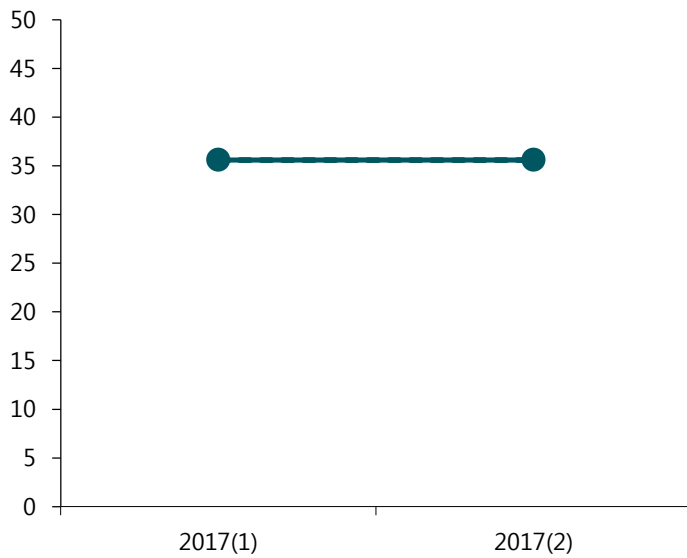

Mio. kr.

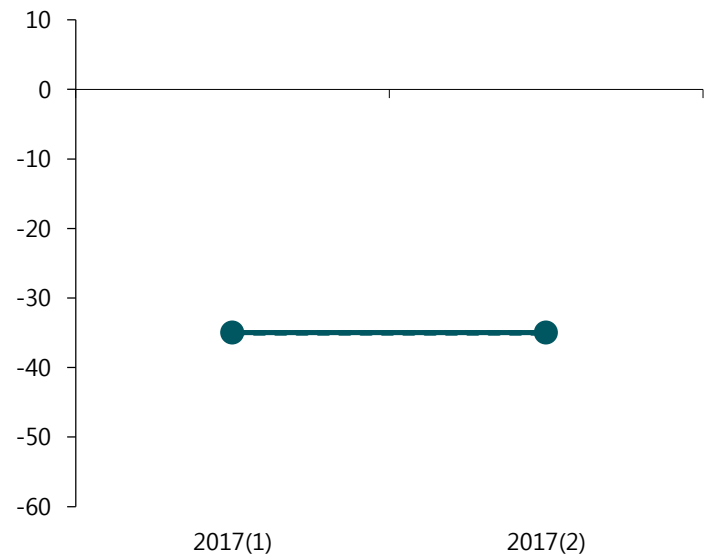

	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
PROJEKT- AFSLUTNING	-	-	-	-	-	-	31-03-2018 (baseline)	31-03-2018
HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	-	-	-	-	-	-	■	■

PROJEKTETS NAVN

Kapacitetsplanlægning

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

Projektet skal levere beregninger og oversigtsbilleder, som gør organisationen i stand til at træffe de rigtige valg i forbindelse med planlægning, allokering, gennemførelse og opfølgning på opgaver i vedligeholdelsesstrukturen under Værnsfælles Forsvarskommando (VFK).

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

20,7 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

2,6 mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING

26. marts 2018

AFVIGELSE IFT. BASELINE

5 måneder



NETTONUTIDSVÆRDI

4,8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



BRUTTOGEVINSTER

30,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

-2,6 mio. kr.

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster.


PROJEKTETS
NAVN

Kapacitetsplanlægning


PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

Mio. kr.

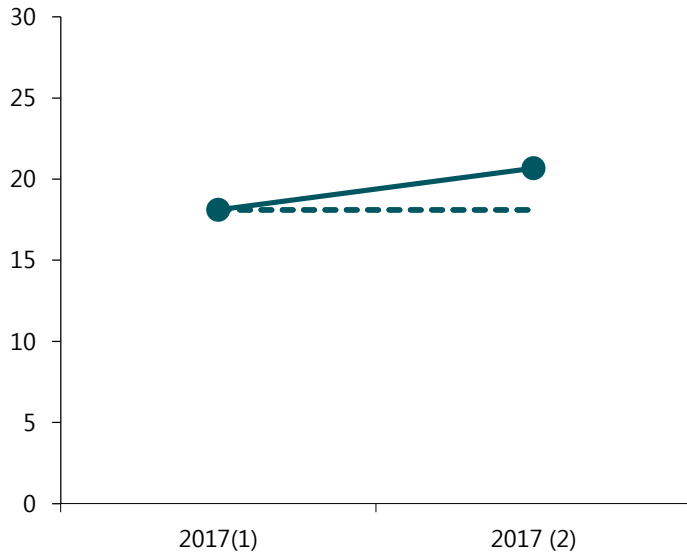

Mio. kr.

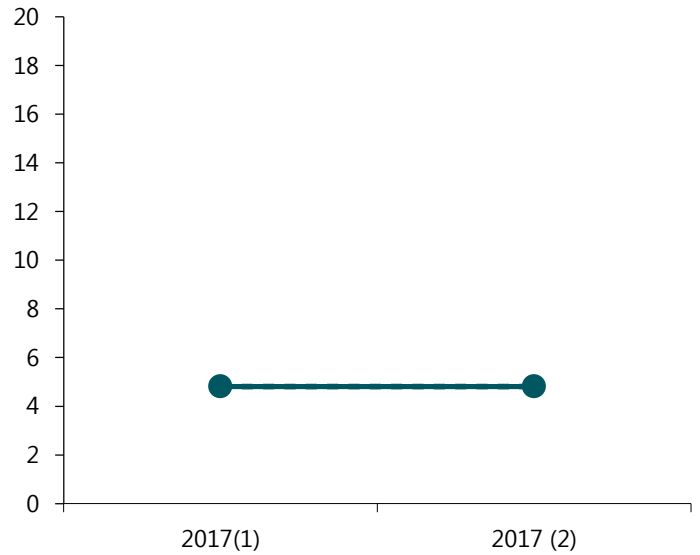

	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
PROJEKT- AFSLUTNING	-	-	-	-	-	-	01-11-2017 (baseline)	26-03-2018
HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	-	-	-	-	-	-	■	■

PROJEKTETS NAVN

LEOPARD

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Lægemiddelstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektets formål er at modernisere det danske lægemiddelregister på en ny standardplatform, så det bliver compliant med krav i den europæiske lægemiddelregulering med ikrafttræden i 2019 og samtidig mere robust og agilt. Moderniseringen består i en skarpt scopet og tilsvarende hurtigt leveret LEOPARD.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbudIngen 

PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbudIngen 

NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbudIngen 

BRUTTOGEVINSTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud

Ingen

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har fem ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN

Landspatientregistret 3 (LPR3)

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Sundhedsdatastyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Helt centralt i Sundhedsdataprogrammets arbejde er udvikling af et nyt Landspatientregister, LPR3, da det eksisterende Landspatientregister (LPR2) ikke kan imødekomme de krav, der er til en fremtidssikret løsning. Ved at gennemføre LPR3-projektet bliver LPR omlagt, så registeret bliver i stand til at levere information om hele patientforløb. LPR3-projektet skal således bidrage til at realisere programmets vision ved at anskaffe og implementere den it-løsning, der skal danne grundlag for beskrivelsen af det samlede patientforløb og sikre større synlighed om resultater på de enkelte sygehusafdelinger og på tværs af sygehuse, regioner og kommuner.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

41,4 mio. kr.*

AFVIGELSE IFT. BASELINE

2,4 mio. kr.

PROJEKTAFLUTNING

1. december 2018

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

NETTONUTIDSVÆRDI

-35,7 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

-1,9 mio. kr.

BRUTTOGEVINSTER

1,9 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER


Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som begge forventes høstet fuldt ud.

* De samlede projektudgifter er ekskl. risikopuljen, som holdes på programniveau. Fordyrelsen skyldes indtrufne risici, hvilket dækkes af risikopuljen.

PROJEKTETS
NAVN


Landspatientregistret 3 (LPR3)

PROJEKTUDGIFTER

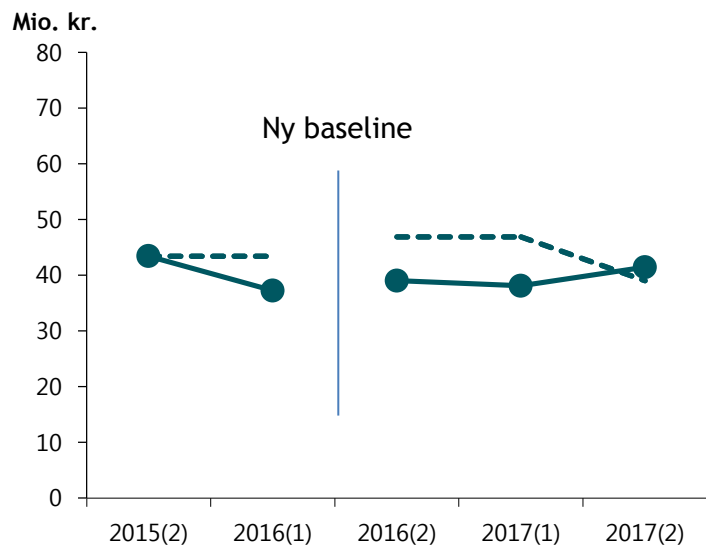

*Baseline for projektudgifterne er ændret for 2017 (2), eftersom risikopuljen er fraregnet.

NETTONUTIDSVÆRDI

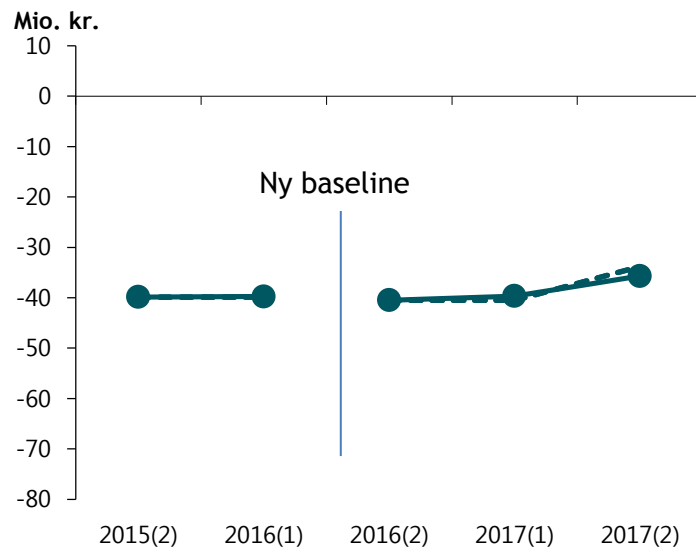

*Baseline er ændret for nettonutidsværdien 2017 (2), eftersom risikopuljen er fraregnet.

PROJEKT- AFSLUTNING	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	-	-	-	04-07-2017 (baseline)	01-12-2018	01-12-2018 (ny baseline)	01-12-2018	01-12-2018

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	-	-	-	■	■	■ (ny baseline)	■	■

PROJEKTETS NAVN

MitID

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet har til formål at gennemføre fornyet udbud af NemID med henblik på fortsat at kunne stille en sikker og brugervenlig eID til rådighed for borgere og erhvervsbrugere i Danmark.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud

-2,6 procent.



PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud

2,9 måneder



NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud

Fortroligt pga. udbud



BRUTTOGEVINSTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud

Fortroligt pga. udbud

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har fire ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN

MSD

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet implementerer SAP-modulet Master Data Governance (SAP MDG) til at systemunderstøtte fremtidige forretningsprocesser i forhold til introduktion af og ændringer til materialemasterdata i DeMars/SAP ECC. SAP MDG skal erstatte det nuværende system til håndtering af materielstamdata, MATDATA.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt pga. udbud

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

Fortroligt pga. udbud

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

Fortroligt pga. udbud

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

BRUTTOGEVINSTER

Fortroligt pga. udbud

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har fire ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN

NemLog-in3

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Kontrakten med leverandøren på den eksisterende NemLog-in-løsning udløber i januar 2019. Derfor skal NemLog-in igen udbydes. Det forventes, at den eksisterende NemLog-in-løsning skal videreføres, men med mulighed for videreudvikling af funktionalitet. Dette skal ske i et agilt setup, hvor nye elementer udvikles, efterhånden som behovet opstår. Projektet skal således sikre en forbedret version af den sikre, nationale platform for login og brugerstyring.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud

3,9 procent.



PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud

Fortroligt pga. udbud



BRUTTOGEVINSTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud

Fortroligt pga. udbud

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN

NemVirksomhed

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

SKAT, Skatteministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Som en del af aftale om Vækstpakke 2014 er regeringen og de øvrige aftaltparter blevet enige om at lancere initiativet NemVirksomhed, som skal reducere enkeltmandsvirksomheders tidsforbrug på bogføring samt afregning af moms og skat gennem etablering af følgende elementer: En bogføringsguide & standardkontoplan i regnskabssystemet til afhjælpning af fejl samt indberetning og afregning af moms og skat ved etablering af interfaces imellem regnskabssystemerne og SKAT.

Målgruppen for NemVirksomhed er enkeltmandsvirksomheder uden ansatte, som ikke har andre pligter end momspligten og som eventuelt handler på tværs af lande inden for EU. Projektet skal således hjælpe til at gøre det lettere at starte og drive selvstændig virksomhed i Danmark. Man skal kunne starte virksomhed og vil få hjælp til de administrative krav, der stilles fra bl.a. SKAT's side, til bl.a. at føre regnskab, at kende moms- og skatteregler, og det er visionen, at virksomhederne på sigt kan foretage "fuld betjening" direkte fra regnskabssystemet uden at skulle anvende SKAT's mange selvbetjeningsløsninger.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

40,3 mio. kr.


AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

1. marts 2018


AFVIGELSE IFT. BASELINE

6,5 måneder 

NETTONUTIDSVÆRDI

-61,4 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

-0,7 mio. kr. 

BRUTTOGEVINSTER

-30,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

-0,6 mio. kr.


IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS
NAVN

NemVirksomhed

PROJEKTUDGIFTER

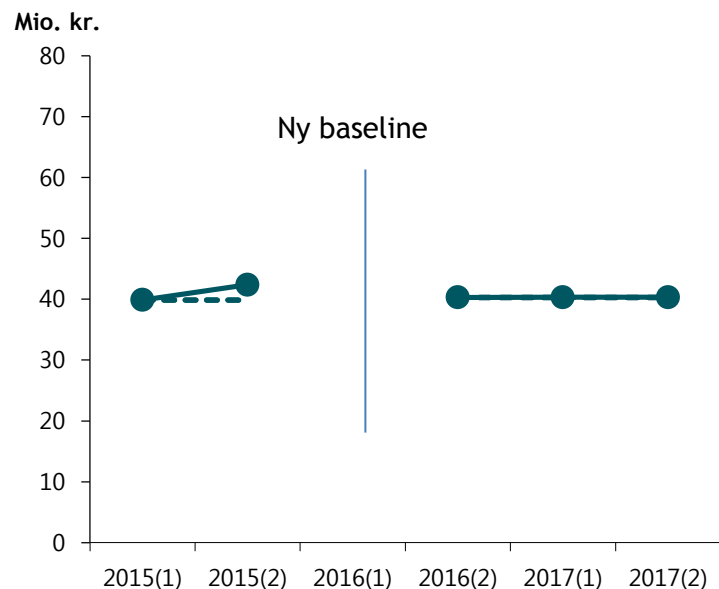



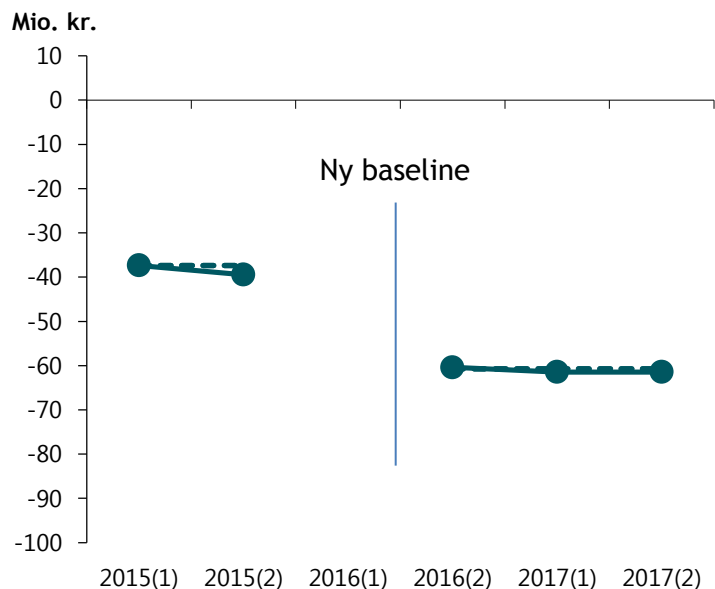

NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	-	-	28-02-2017 (baseline)	28-02-2017	15-08-2017 (ny baseline)	18-12-2017	05-02-2018	01-03-2018

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	-	-	■	■	■ (ny baseline)	■	■	■



PROJEKTETS NAVN	Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)	
SAMLET TRAFIKLYS		
MYNDIGHED	Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet	
PROJEKTETS FORMÅL	Effektivisering	
BESKRIVELSE	<p>På det gymnasiale område har Undervisningsministeriet de seneste år gennemført analyser af forskellige modeller for digitalisering af prøveprocesser, hvor udfaldet er blevet en anbefaling af en central løsning. Parallelt er der en fortsat løbende dialog med sektorens lederforeninger, som tilkendegiver, at sektoren er klar.</p> <p>Det primære formål med indførelse af XIT på de gymnasiale uddannelser er effektivisering. Effektivisering opnås ved at tilvejebringe en it-løsning, der digitaliserer prøveprocesserne ved de skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser (stedprøver, SRP, SRO), således at de papirrelaterede manuelle arbejdsgange afskaffes.</p>	
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse	
PROJEKTUDGIFTER	43,9 mio. kr.	
AFGIVELSE IFT. BASELINE	Ingen	
PROJEKTAFLUTNING	1. juni 2018	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen	
NETTONUTIDSVÆRDI	-10,7 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	-29,0 mio. kr.	
BRUTTOGEVINSTER	38,5 mio. kr.	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	-41,2 mio. kr.	
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, som forventes høstet fuldt ud.	

PROJEKTETS
NAVN

Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)

PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

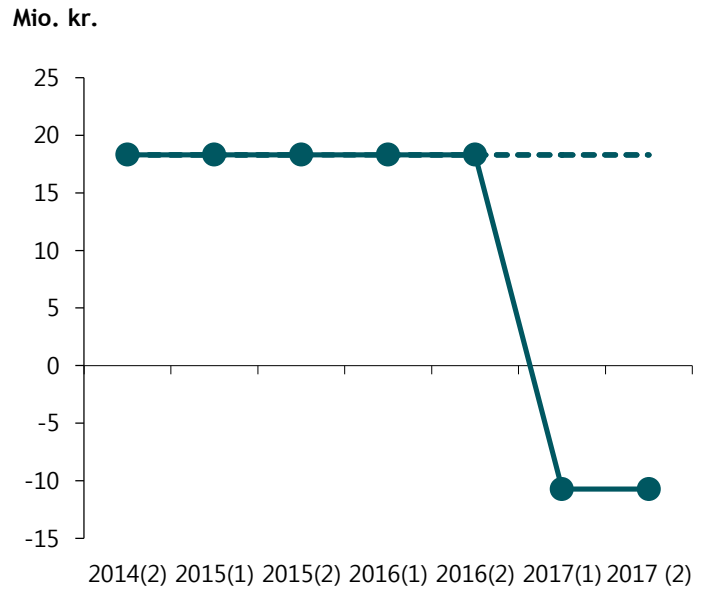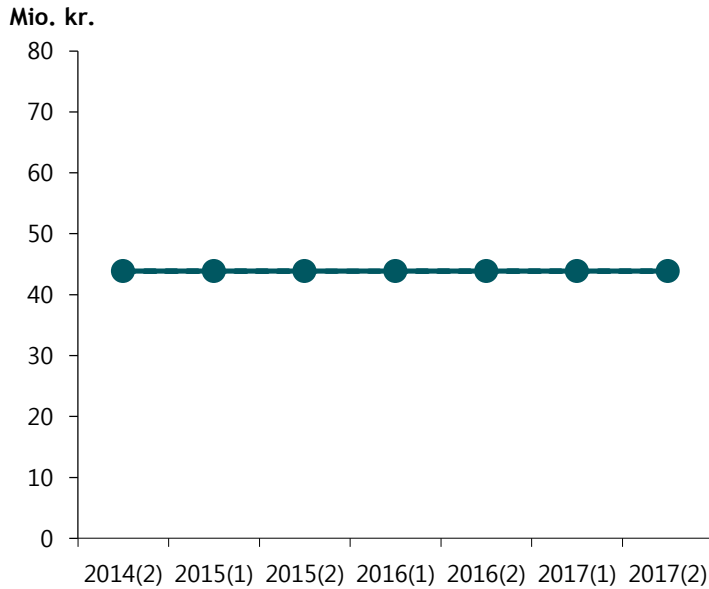

PROJEKT- AFSLUTNING	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	-	01-06-2018 (baseline)	01-06-2018	01-06-2018	01-06-2018	01-06-2018	01-06-2018	01-06-2018

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	-	■	■	■	■	■	■	■

PROJEKTETS NAVN

Nyt Politi.dk

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Rigspolitiet, Justitsministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektets formål er anskaffelse af en ny tidssvarende hjemmeside til politiet, herunder en løsning til håndtering af politiets krisekommunikation ved større hændelser, inkorporering af nuværende separate hjemmesider i politiet samt anskaffelse af eksternt vedligehold og drift af den samlede løsning.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

19,3 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

28. februar 2019

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

-16,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

BRUTTOGEVINSTER

1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER



Projektet har fem ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS
NAVN

Nyt Politi.dk




PROJEKTUDGIFTER

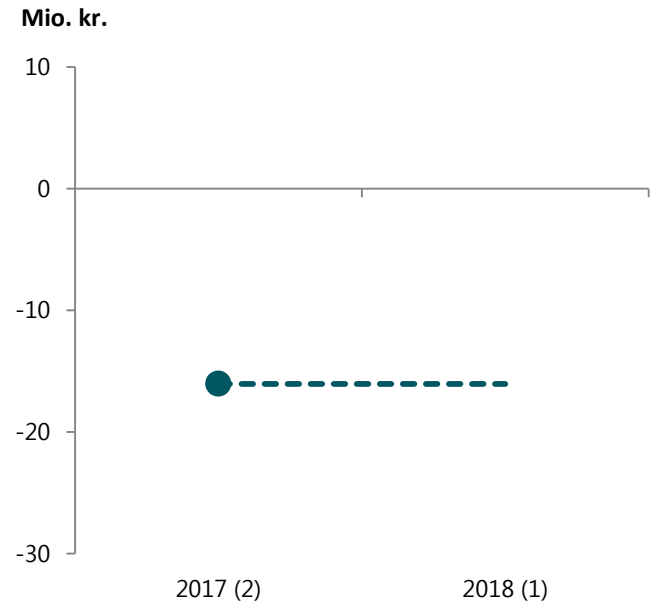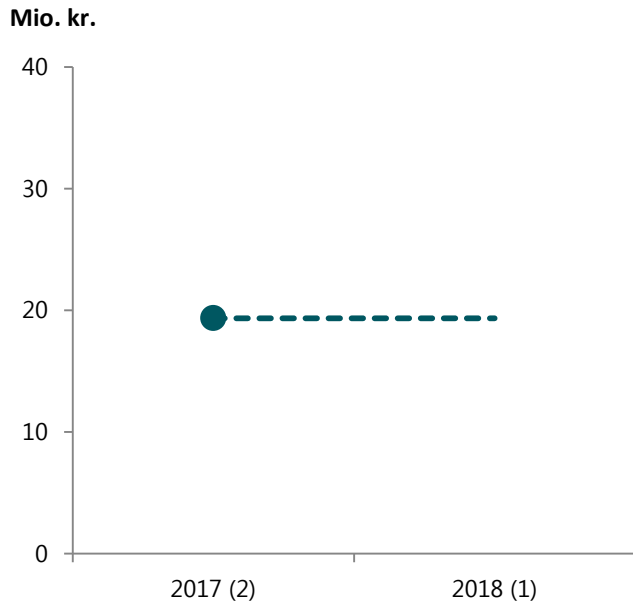NETTONUTIDSVERDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	-	-	-	-	-	-	-	28-02-2019 (baseline)


HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	-	-	-	-	-	-	-	■

PROJEKTETS NAVN	Nyt SIS
SAMLET TRAFIKLYS	
MYNDIGHED	Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet
PROJEKTETS FORMÅL	Effektivisering
BESKRIVELSE	<p>Med Nyt SIS stilles et nyt studieadministrativt system til rådighed for studieadministrationen på professionshøjskolerne, erhvervsakademierne og de omfattede maritime uddannelsesinstitutioner. Systemet udgør en del af den samlede it-understøttelse af det studieadministrative område.</p> <p>Funktionaliteten i det nye system vil dække de studieadministrative kerneopgaver og arbejdsprocesser, som institutionerne er pålagt som følge af nationale regler og lovgivning. Målet er at sikre et mere effektivt og sikkert samspil med institutionernes lokale 3. partsystemer. Tilsvarende skal systemet kunne integrere med centrale 3. partsystemer som fx Uddannelsesguiden, Ungedatabasen, Optagelse.dk/KOT, US 2000, CPR-registeret, Navision Stat, CVR, som trækker på eller leverer data til Nyt SIS.</p>
NUVÆRENDE FASE	Gennemførelse
PROJEKTUDGIFTER	175,9 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	-2,1 mio. kr. 
PROJEKTAFLUTNING	28. februar 2021
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
NETTONUTIDSVÆRDI	16,7 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	-0,2 mio. kr. 
BRUTTOGEVINSTER	215,5 mio. kr.
AFVIGELSE IFT. BASELINE	-2,56 mio. kr.
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, som forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS
NAVN

Nyt SIS

PROJEKTUDGIFTER

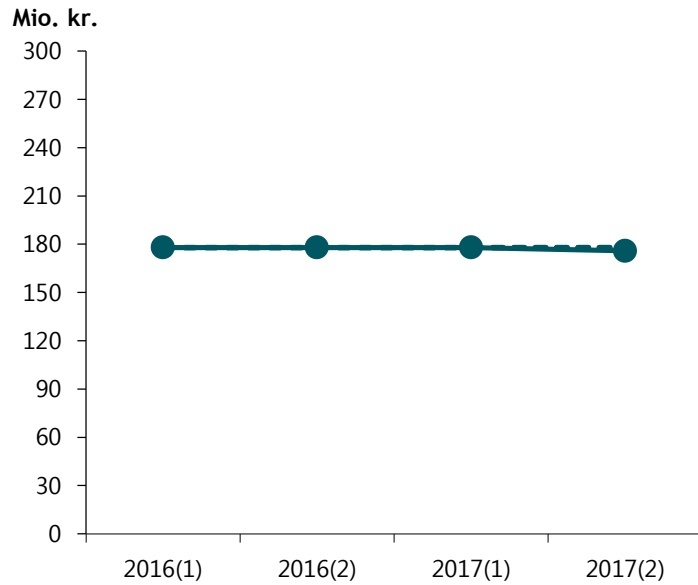

NETTONUTIDSVÆRDI

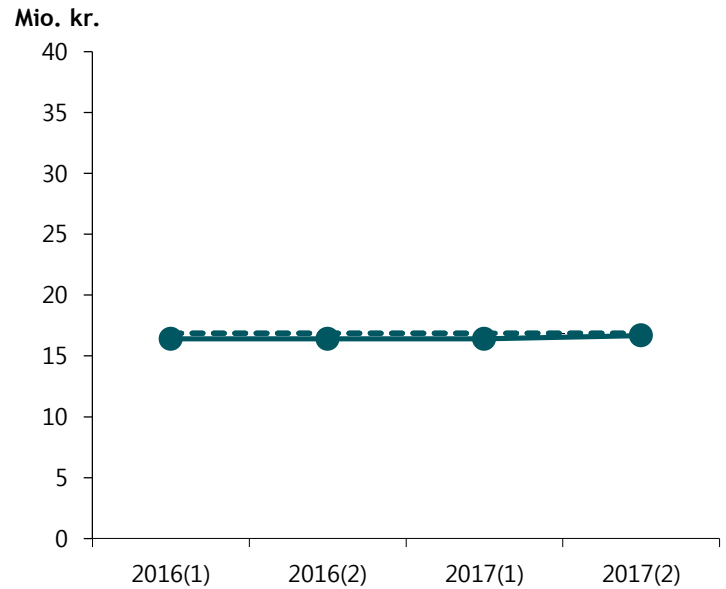

PROJEKT- AFSLUTNING	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	-	-	-	-	28-02-2021 (baseline)	28-02-2021	28-02-2021	28-02-2021
HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	-	-	-	-	■	■	■	■

PROJEKTETS NAVN

Nyt Tjenestetidssystem

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

Som en del af reorganiseringen i Kriminalforsorgen etableres en områdestruktur, der indebærer, at planlægning ikke fremadrettet vil finde sted institution for institution, men for et område samlet. Derfor etableres et tjenestetidssystem, der muliggør planlægning på områdeniveau.

Som led i etableringen af et nyt tjenestetidssystem ses yderligere mulighed for effektivisering ved at nedbringe udgifterne til indkaldelse af vagtpersonale ved bl.a. sygdom. Nedbringelsen sker, fordi der automatisk dannes vagtplaner, der på baggrund af indbyggede logikker i tjenestetidssystemet, optimerer mulighederne for, at der disponeres personale, der kan indkaldes og dække vagten. Herved sparer Kriminalforsorgen udgifter til ekstrabetaling af personale. Endelig har projektet til formål at bidrage til et kvalitetsløft fsva. bl.a. arbejdsmiljø og bedre it-infrastruktur. Et nyt og moderne tjenestetidssystem kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø, da den automatiske udarbejdelse af vagtplaner sker i overensstemmelse med fastlagte regler.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

25,7 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

1. februar 2019

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

-11,8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

BRUTTOGEVINSTER

14,3 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen


IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS
NAVN

Nyt Tjenestetidssystem

PROJEKTUDGIFTER

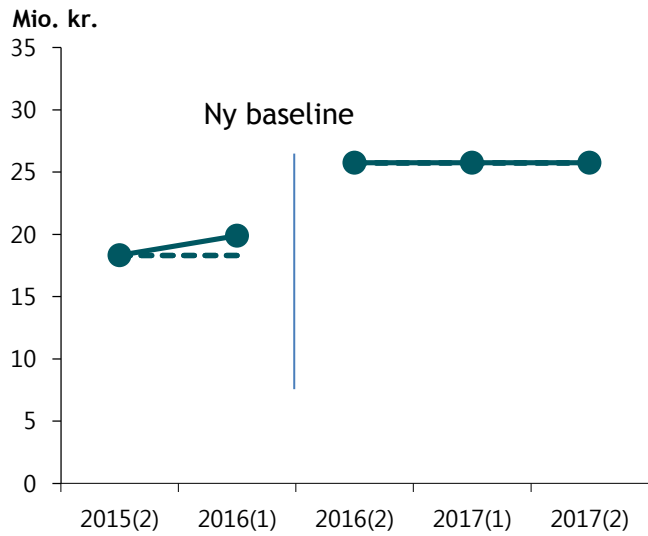

NETTONUTIDSVÆRDI

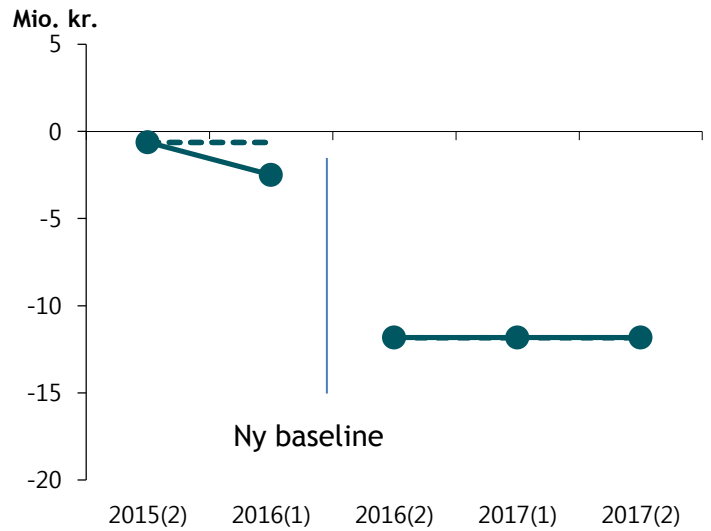

PROJEKT- AFSLUTNING	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	-	-	-	18-12-2017 (baseline)	18-12-2017	01-02-2019 (ny baseline)	01-02-2019	01-02-2019

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	-	-	-	■	■	■ (ny baseline)	■	■

PROJEKTETS NAVN

Næste generation Digital Post

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Næste generation Digital Post er løsningen, der skal erstatte den nuværende Digital Post løsning. Projektet der skal etablere den fremtidige løsning, har følgende formål: Øge effektiviteten, forbedre oplevelsen af Digital Post-løsningen samt levere Danmarks enkle kommunikationsløsning, der er fremtidssikret, og kan bruges af alle til at distribuere og modtage vigtig information, herunder sikker og uafviselig post jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere. Projektets vision er formuleret som følgende: Danmarks enkle kommunikationsløsning til vigtig information.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt pga. udbud

AFGIVELSE IFT. BASELINE

0,6 procent.



PROJEKTAFLUTNING

Fortroligt pga. udbud

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

Fortroligt pga. udbud

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud



BRUTTOGEVINSTER

Fortroligt pga. udbud

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN

OMS-projektet

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Kriminalforsorgen, Justitsministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Kriminalforsorgen ønsker at udskifte det eksisterende klientsystem (KS) med en standardløsning kaldet OMS (Offender Management System). Forventninger er, at et OMS vil kunne dække langt de fleste af Kriminalforsorgens behov for it-understøttelse af klientrettede opgaver - og tilbyde mange nye muligheder, som vil lette og forbedre klienthåndteringen.


NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

Fortroligt pga. udbud

AFGIVELSE IFT. BASELINE

2,9 procent 

PROJEKTAFLUTNING

Fortroligt pga. udbud


AFVIGELSE IFT. BASELINE

12 måneder 

NETTONUTIDSVÆRDI

Fortroligt pga. udbud

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud 

BRUTTOGEVINSTER

Fortroligt pga. udbud

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbud

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har fem ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN

POL-INTEL

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Rigspolitiet, Justitsministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Dansk politi har igangsat et projekt til anskaffelse og implementering af en analyseplatform. En analyseplatform er et sammenhængende system til bearbejdning og analyse af de store datamængder, som generes både internt og eksternt; og som giver dansk politi helt nye muligheder for at arbejde proaktivt, effektivt og integreret med kriminalitetsforebyggelse, efterforskning og monitorering, også kendt som intelligence-led policing.

Analyseplatformen baseres på et velafprøvet standardssystem (COTS). Derfor findes der minimum fem realistiske leverandører af en analyseplatform, der vil kunne adressere det ”åbne” politi (og PETs) behov. POL-INTEL vil derfor blive baseret på et velafprøvet standardssystem (COTS), som skal konfigureres, så det passer til det ”åbne” politis behov. Derudover vil der skulle skabes integrationer til de eksisterende datakilder i det ”åbne” politi samt til PET.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

99,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

15. marts 2018


AFVIGELSE IFT. BASELINE

2,5 måneder 

NETTONUTIDSVÆRDI

-57,9 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

-0,9 mio. kr. 

BRUTTOGEVINSTER

43,4 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen


IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har ti ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS
NAVN

POL-INTEL

PROJEKTUDGIFTER

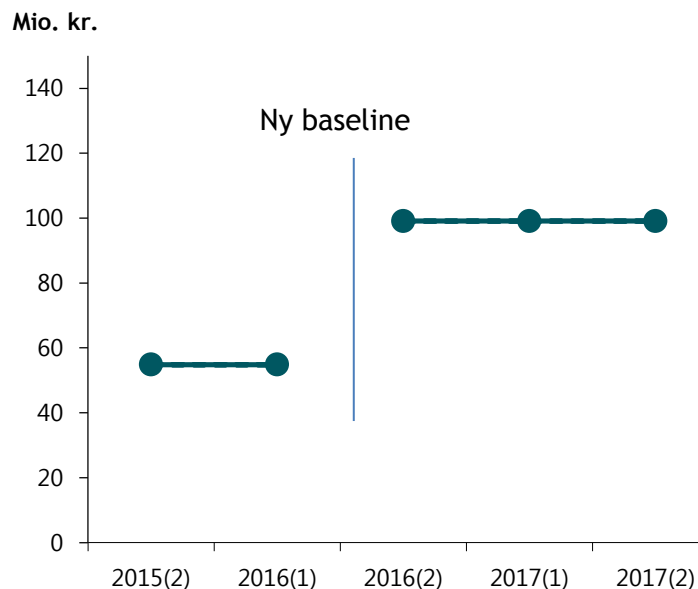

NETTONUTIDSVÆRDI

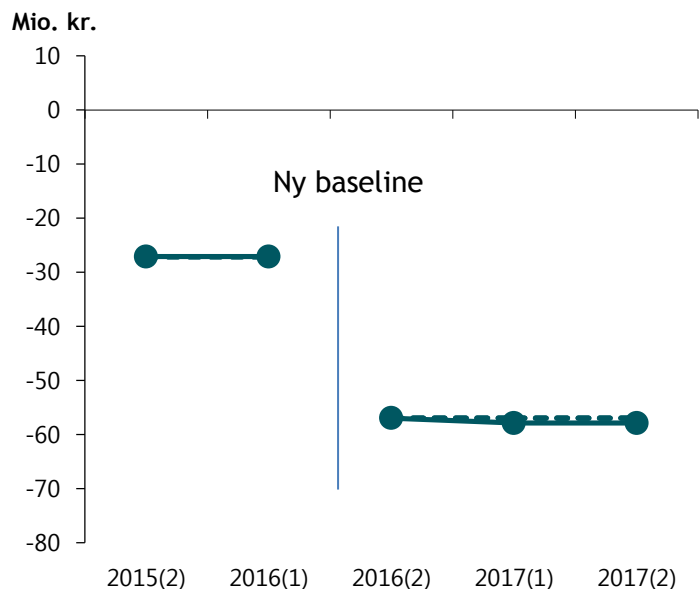

PROJEKT- AFSLUTNING	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	-	-	-	01-07-2017 (baseline)	01-07-2017	01-01-2018 (ny baseline)	01-01-2018	15-03-2018

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	-	-	-	■	■	■ (ny baseline)	■	■

PROJEKTETS NAVN

Projekt Tidsstyring

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

BESKRIVELSE

Formålet med Projekt Tidsstyring og Forsvarsministeriets nye arbejdstidsregistrering for arbejdstid, ferie og friheder er effektivisering. Effektiviseringen skabes primært gennem en større anvendelse af SAP-standardløsninger på tværs af koncernen. Effektivisering sker gennem en medarbejder- og lederportal, hvor planlægning, registrering og opfølgning på arbejdstid kan ske gennem en automatisk og direkte dialog mellem chefer og medarbejdere. Anvendelsen af portalløsningen, automatisering af delprocesser samt en øget registreringshyppighed og godkendelse af arbejdstid vil medføre, at rapporteringen vil blive forbedret, og cheferne vil have et mere solidt og aktuelt styringsgrundlag.

Projektet er på pause, mens der gennemføres eksternt review, der skal belyse projektets videre proces. Efter aftale med It-rådet har projektet ikke statusrapporteret og fastholder det røde trafiklys fra seneste statusrapportering.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

Afventer review

AFGIVELSE IFT. BASELINE

PROJEKTAFLUTNING

Afventer review

AFVIGELSE IFT. BASELINE

NETTONUTIDSVÆRDI

Afventer review

AFVIGELSE IFT. BASELINE

BRUTTOGEVINSTER

Afventer review

AFVIGELSE IFT. BASELINE

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Afventer review

PROJEKTETS NAVN

RejsUd

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet skal sikre, at der efter et udbud vil være en systemunderstøttelse af udlægs- og rejseafregning for statslige institutioner og for institutioner i selvejesektoren, der fortsat vil have mulighed for at tilslutte sig løsningen.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

23,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

2,0 mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING

1. juni 2018

AFVIGELSE IFT. BASELINE

17 måneder



NETTONUTIDSVÆRDI

-15,6 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

2,7 mio. kr.



BRUTTOGEVINSTER

5,7 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

3,7 mio. kr.


IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS
NAVN

RejsUd

PROJEKTUDGIFTER

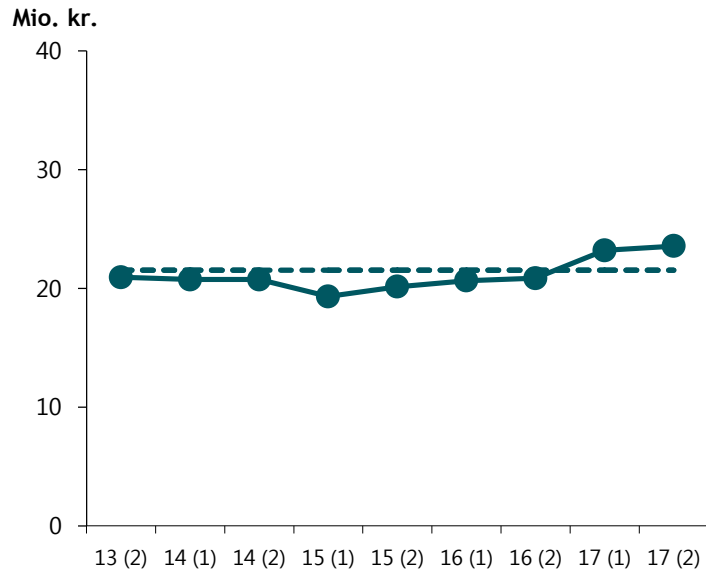

NETTONUTIDSVÆRDI

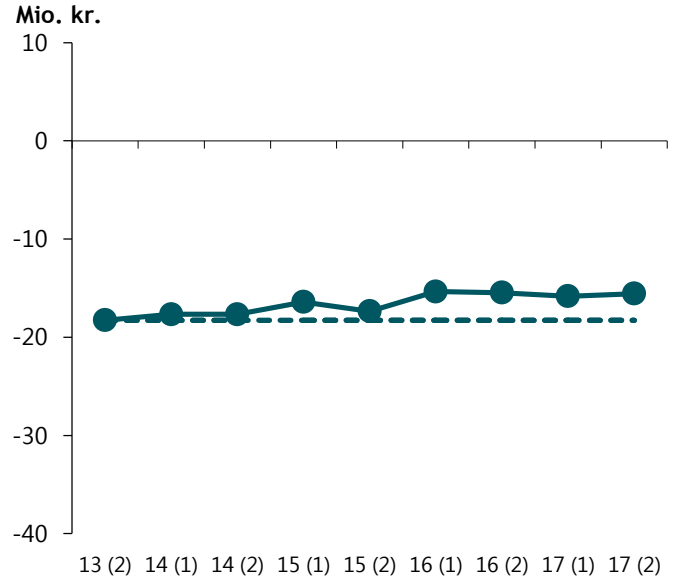

PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	01-01-2016 (baseline)	01-01-2017	01-01-2017 (ny baseline)	01-01-2017	01-01-2017	01-10-2017	01-10-2017	01-06-2018	01-06-2018

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	■	■	■ (ny baseline)	■	■	■	■	■	■

PROJEKTETS NAVN

SABA

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projekt SABA gennemføres som et kvalitetsløftsprojekt med fokus på at fjerne de brændende platforme, som i dag udgør Naturstyrelsens (NST) systemunderstøttelse, og sikre at NST fremover har en løsning, der løbende kan udbygges, efterhånden som behovet opstår – eller som nye teknologiske muligheder giver potentiale for at effektivisere. Løsningen skal understøtte en række effektiviseringstiltag og omlægninger i forretningen. Disse er en del af et direktionsprojekt, der har det opdrag at implementere budgetanalysens krav til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen lukker desuden en række systemer ned, der i dag kører på hver sin server og har nogle forholdsvis store drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, og erstatter det med et system på en moderne platform.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

26,2 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

-1,2 mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING

1. januar 2019

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



NETTONUTIDSVÆRDI

-11,8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

3,8 mio. kr.



BRUTTOGEVINSTER

14,8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE


4,1 mio. kr.

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER


Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN **SABA**

PROJEKTUDGIFTER

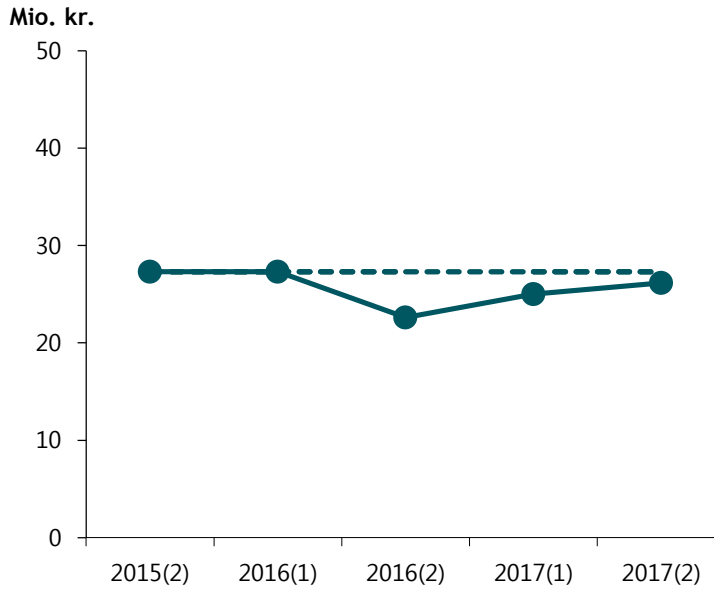

NETTONUTIDSVÆRDI

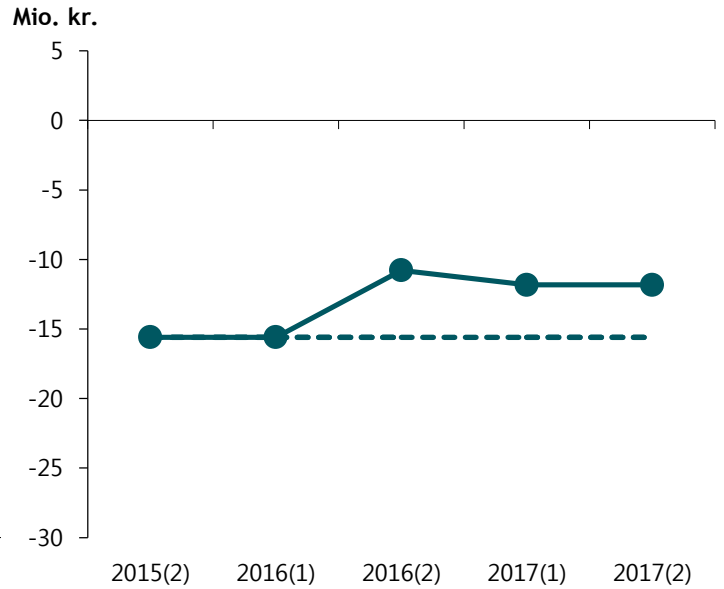

	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
PROJEKT-AFSLUTNING	-	-	-	01-01-2019 (baseline)	01-01-2019	01-01-2019	01-01-2019	01-01-2019
HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	-	-	-	■	■	■	■	■

PROJEKTETS NAVN	SAP38
SAMLET TRAFIKLYS	Intet trafiklys
MYNDIGHED	SKAT, Skatteministeriet
PROJEKTETS FORMÅL	Lovgivningsprojekt
BESKRIVELSE	Hovedformålet er at sikre hurtig og sikker tilkobling til det nye inddrivelsessystem (NyMF/PSRM) for Skattekontoen, uden at bringe driftsstabiliteten i fare. Projektet vil udelukkende sikre, at gøre det muligt for Skattekontoen, at levere ubetalte krav (fordringer) til inddrivelse på den måde, som Gældsstyrelsen ønsker fordringerne leveret fremadrettet.
NUVÆRENDE FASE	Projektet er på nuværende tidspunkt sat på pause, og der afventes afklaring om projektets scope.

PROJEKTETS NAVN

SARA (Fælles museums-it)

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

SARA er et infrastrukturprojekt til de danske statslige og statsanerkendte museer i form af et nyt fælles informationssystem til registrering og håndtering af samlinger, genstande og kunstværker. Systemet afløser en række forskellige og overvejende ældre databaser.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

24,8 mio. kr.

AFGIVELSE IFT. BASELINE

-4,9 mio. kr.



PROJEKTAFSLUTNING

31. december 2018

AFVIGELSE IFT. BASELINE

3 måneder



NETTONUTIDSVÆRDI

5,1 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

5,1 mio. kr.



BRUTTOGEVINSTER

35,9 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

1,7 mio. kr.


IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har otte ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS
NAVN

SARA (Fælles museums-it)

PROJEKTUDGIFTER

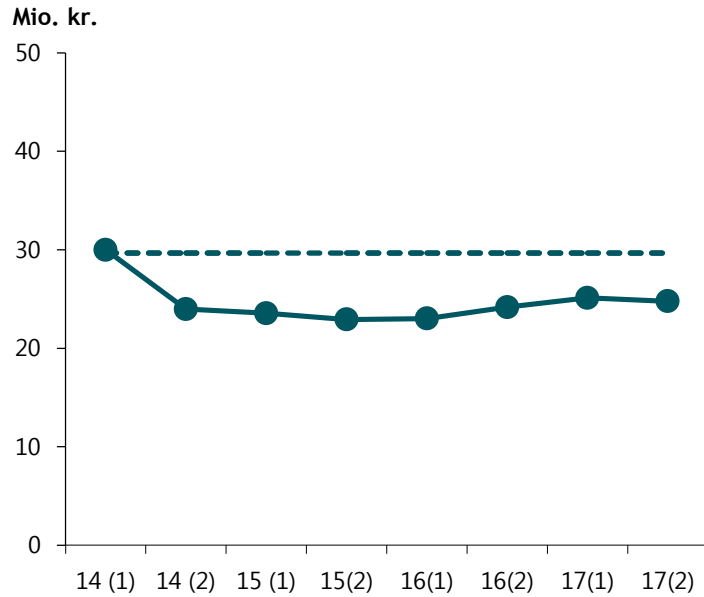

NETTONUTIDSVÆRDI

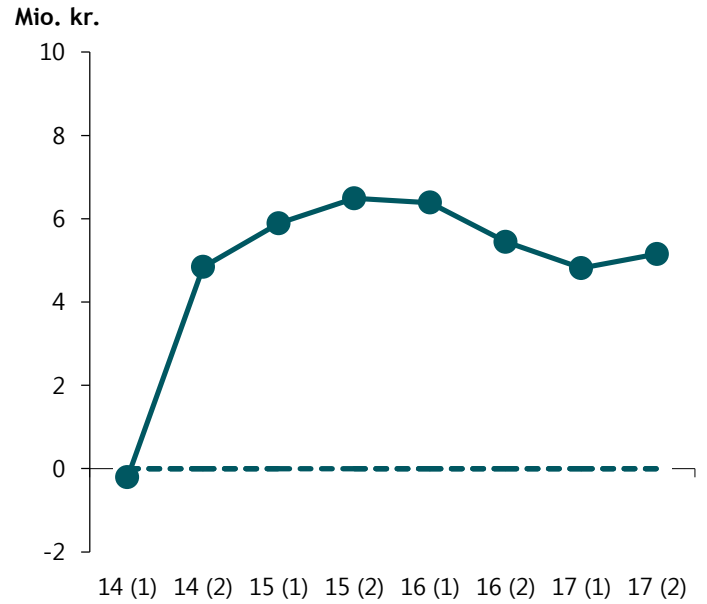

PROJEKT- AFSLUTNING	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	01-10-2018 (baseline)	30-06-2017	30-06-2017	30-06-2017	30-06-2017	31-12-2017	30-06-2018	31-12-2018

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
	■	■	■	■	■	■	■	■

PROJEKTETS NAVN

Skattekontoen

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

SKAT, Skatteministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivning

BESKRIVELSE

At skabe forudsætninger for, at SKAT kan levere fordringer til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem fra fagsystemet Skattekontoen (SKO).

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbudIngen 

PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbudIngen 

NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt pga. udbudIngen 

BRUTTOGEVINSTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

Projektet har ingen økonomiske gevinster, men understøtter ICI i at realisere sine gevinster.

IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster, men understøtter ICI i at realisere sine gevinster.

PROJEKTETS NAVN

Vanda

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Danmarks Miljøportal, Miljø- og Fødevarerministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Formålet med projektet er at erstatte forældede systemer og databaser med et nyt fælles tidssvarende fagsystem. Endvidere er projektet en forudsætning for at kunne forbedre datagrundlaget på overfladevandsområdet på tværs af Danmarks Miljøportals parter og sikre offentlig adgang til disse data via fællesoffentlige datastandarder og begrebsmodeller. Det primære formål med projektet er således, i It-projektmodellens forstand, relateret til et kvalitetsløft i datakvalitet for Danmarks Miljøportals parter. Formålet er på et strategisk niveau at sikre kvalitetsfyldte beslutninger i forhold til større politiske initiativer og satsninger omkring overfladevand i Danmark, men også som input i forhold til afrapportering til EU.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

48,5 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

PROJEKTAFLUTNING

1. januar 2020

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

NETTONUTIDSVÆRDI

-54,7 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

BRUTTOGEVINSTER

-14,8 mio. kr.

AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen


IKKE-ØKONOMISKE
GEVINSTER

Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS
NAVN

Vanda

PROJEKTUDGIFTER

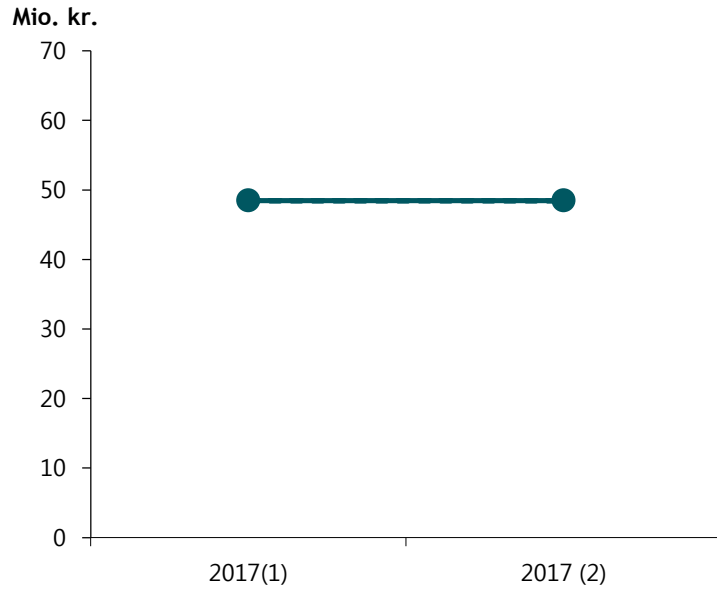

NETTONUTIDSVÆRDI

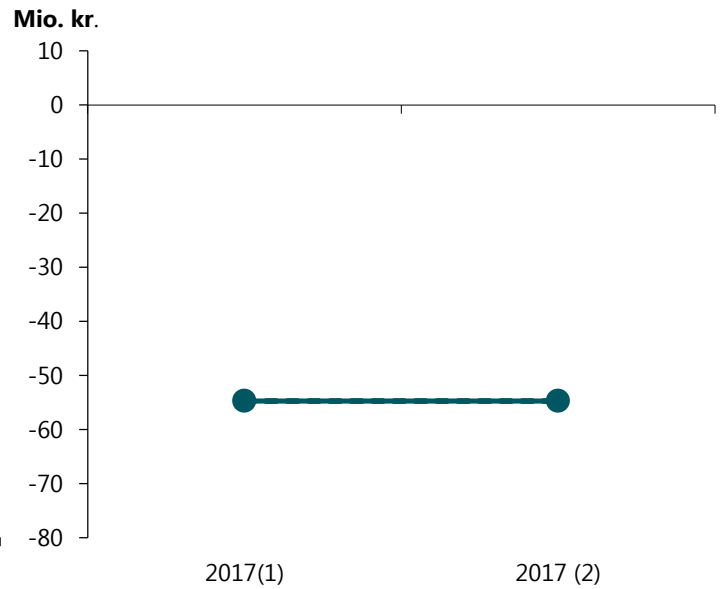

	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)
PROJEKT- AFSLUTNING	-	-	-	-	-	-	01-01-2020 (baseline)	01-01-2020
HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	-	-	-	-	-	-	■	■
