


# Appendiks – it-projekter 2. halvår 2019

Retningslinjer .....	1
Læsevejledning.....	2
Beskæftigelsesministeriet .....	3
Erhvervsministeriet .....	4
Finansministeriet.....	5
Forsvarsministeriet.....	7
Justitsministeriet .....	8
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet .....	10
Kulturministeriet .....	12
Miljø- og Fødevarerministeriet.....	13
Skatteministeriet.....	15
Sundheds- og Ældreministeriet .....	17
Transport- og Boligministeriet .....	18
Uddannelses- og Forskningsministeriet.....	19
Udlændinge og Integrationsministeriet.....	20

## Retningslinjer

Alle igangværende statslige it-projekter<sup>1</sup> med projektudgifter på 10 mio. kr. eller derover indberetter halvårligt deres status til Statens It-råd.

Fire målbare parametre har betydning for Statens It-råds vurdering af, om projekterne skal have et rødt, gult eller grønt trafiklys ved den halvårslige statusrapportering: Forventede projektudgifter, overholdelse af tidsplan samt forventninger til realisering af økonomiske<sup>2</sup> og ikke-økonomiske gevinster. Det sidste parameter er kun relevant for projekter, hvis primære formål er at skabe kvalitetsløft og ikke effektivisering.

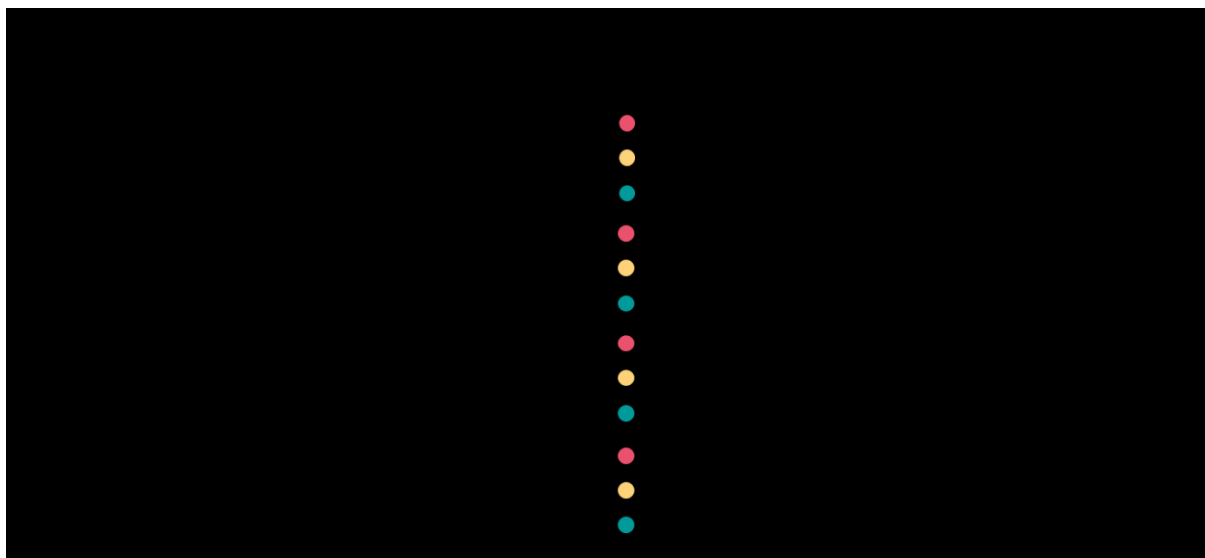

Alle indberettede beløb, inklusiv baseline, er justeret til 2020-priser. Det understreges, at den samlede status for projektet er en helhedsvurdering fra Statens It-råd, der bygger på flere faktorer end ovennævnte.

Alle informationer om projekterne i dette appendiks er videregivet som indberettet af myndighederne.

<sup>1</sup> Fortrolige projekter indgår ikke i appendikset.

<sup>2</sup> De samlede bruttogevinster er beregnet som forskellen mellem to fremtidige driftsscenarier. Et scenarie hvor projektet gennemføres og et hvor projektet ikke gennemføres.

## Læsevejledning

Eksempel på status på projekter for ét ministerområde

Tidspunkt for rapportering						Angiver projektafslutning. Afsluttede projekter tildeles ikke trafiklys	Projektnavn	Institution	Fase	Primært formål	Indberettede forventede projektudgifter. Parentesen viser afvigelsen fra projektets baseline i pct.	Indberettede forventede projektafslutning. Parentesen viser afvigelsen fra projektets baseline	Indberettede forventede bruttogevinster. Parentesen viser afvigelsen fra projektets baseline i pct.	Indberettede forventning om realisering af ikke-økonomiske gevinster	
2017 (1)	2017 (2)	2018 (1)	2018 (2)	2019 (1)	2019 (2)										Projektudgifter (afvigelse fra baseline)
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Nyt aktstykke eller ny baseline</div>						●	Afs.	Projekt #1	Styrelse #1	G	E	15 mio. kr. (5 pct. fordyret)	01-01-2020 (6 måneder forsinket)	-10 mio. kr. (-3 pct. forværret)	I ringe grad
●	●	●	●	●	●			Projekt #2	Styrelse #2	A	K	Fortroligt pga. udbud	Fortroligt pga. udbud	Fortroligt pga. udbud	I nogen grad
●	●	●	●	●	●			Projekt #3	Styrelse #3	R	L	100 mio. kr. (-5 pct. reduceret)	01-06-2021 (To måneder før tid)	20 mio. kr. (5 pct. forbedret)	I høj grad

Trafiklysvurdering

**Fase:**  
 - Anskaffelse (A)  
 - Gennemførelse (G)  
 - Realisering (R)

**Formål:**  
 - Effektivisering (E)  
 - Kvalitetsløft (K)  
 - Lovgivning (L)

- Projektet vurderes at afvige væsentligt fra den aftalte baseline. It-rådet indkalder myndigheden til et møde med henblik på sparring.
- Projektet vurderes delvist at afvige fra den aftalte baseline og kan måske have behov for sparring med It-rådet.
- Projektet vurderes at være på sporet i forhold til den aftalte baseline.

## Beskæftigelsesministeriet

### Projekter

PROJEKTNAMN	BESKRIVELSE	PRIMÆRE LEVERANDØR
EESSI	Projektet er en del af EESSI programmet, som foruden knudepunkt og gateway omfatter sagshåndteringssystemet RINA samt fire lokale tilkoblingsprojekter. Projektet EESSI har til formål at etablere et nationalt knudepunkt og tilhørende gateway til udveksling af sociale data mellem sociale sikringsinstitutioner i EU i en standardiseret form. Herudover skal projektet etablere en solid infrastruktur, som sætter danske institutioner i stand til at varetage sagsforvaltning af vandrende arbejdstagere korrekt og bidrage til den tværoffentlige indsats for kontrol af sociale ydelser.	EU-kommissionen, Edora og Statens IT

### Status på projekter

2017 (1)	2017 (2)	2018 (1)	2018 (2)	2019 (1)	2019 (2)	Projekt navn	Institution	Fase	Primært formål	Projektudgifter (afvigelse fra baseline)	Projektafslutning (afvigelse fra baseline)	Bruttogevinster (afvigelse fra baseline)	Forventning til realisering af Ikke-økonomiske gevinster
●	●	●	●	●	●	EESSI	STAR <sup>3</sup>	G	L	18,4 mio. kr. (Ingen afvigelse)	01-07-2020 (12 mdr. forsinket)	-29,1 mio. kr. (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke

<sup>3</sup> Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

## Erhvervsministeriet

## Projekter

PROJEKTNAMN	BESKRIVELSE	PRIMÆRE LEVERANDØR
Digitalt Skibsregister	Konkret vil projektet medføre digitalisering af selve indberetningen til registrering af skibe (herunder ejer-, panterrettigheder mv.), således at sagsgangen sker langt hurtigere og mere effektivt.	Netcompany A/S

## Status på projekter

2017 (1)	2017 (2)	2018 (1)	2018 (2)	2019 (1)	2019 (2)	Projekt navn	Institution	Fase	Primært formål	Projektudgifter (afvigelse fra baseline)	Projektafslutning (afvigelse fra baseline)	Bruttogevinster (afvigelse fra baseline)	Forventning til realisering af Ikke- økonomiske gevinster
-	-	-	-	●	●	Digitalt Skibsregister	Søfarts- styrelsen	G	K	19,6 mio. kr. (-7,3 pct. reduceret)	01-12-2020 (3 mdr. forsinket)	70,3 mio. kr. (ingen afvigelse)	I høj grad

## Finansministeriet

### Projekter

PROJEKTNAMN	BESKRIVELSE	PRIMÆRE LEVERANDØR
HR-projektet	Projektet skal anskaffe et fællesstatsligt system til at understøtte HR-opgaverne inden for områderne personaleadministration, organisationsstyring og tidsregistrering. Projektet fokuserer på anskaffelse af et standardsystem samt konsulentassistance til at foretage væsentlige tilpasninger og udvidelser af pågældende standardsystem og implementere det i statens institutioner.	Miracle A/S
Statens Budgetsystem (tidl. Fællesstatsligt budgetsystem)	Projektet skal skabe et fællesstatsligt system til at varetage opgaverne omkring budgetlægning og -opfølgning i alle statslige institutioner. Derudover skal systemet understøtte ministeriernes koncerntstyring. Projektet vil omhandle anskaffelse af et standardsystem samt konsulentassistance til at foretage tilpasninger af pågældende standardsystem samt at understøtte en implementering i alle statens institutioner.	KMD A/S
MitID	Projektet har til formål at gennemføre fornyet udbud af NemID med henblik på fortsat at kunne stille en sikker og brugervenlig eID og digital signaturløsning til rådighed for borgere og erhvervsbrugere i Danmark.	Nets DanID A/S
NemLog-in3	Kontrakten med leverandøren på den eksisterende NemLog-in-løsning udløber i januar 2019. Derfor skal NemLog-in igen udbydes. Det forventes, at den eksisterende NemLog-in-løsning skal videreføres, men med mulighed for videreudvikling af funktionalitet. Dette skal ske i et agilt setup, hvor nye elementer udvikles, efterhånden som behovet opstår. Projektet skal således sikre en forbedret version af den sikre, nationale platform for login og brugerstyring.	NNIT og Nets DanID A/S m. signaturgruppen
Næste generation Digital Post	Næste generation Digital Post (NgDP) er løsningen, der skal erstatte den nuværende Digital Post løsning. Projektet der skal etablere den fremtidige løsning, har følgende formål: Øge effektiviteten, forbedre oplevelsen af Digital Post-løsningen samt levere Danmarks enkle kommunikationsløsning, der er fremtidssikret, og kan bruge af alle til at distribuere og modtage vigtig information, herunder sikker og uafviselig post jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere.	Netcompany A/S
Grunddataprogrammet	Formålet med Grunddataprogrammet er at sikre en effektiv anvendelse af offentlige grunddata gennem forbedret kvalitet, fri adgang og fælles distribution af data. Bedre anvendelse af de offentlige myndigheders data er en vej til betydelige effektiviseringer i det offentlige og til serviceforbedringer til borgere og virksomheder.	N/A

Digitalt Kørekort	Projektet har til formål at etablere et digitalt kørekort, i form af en kørekort-app, som kan tages i brug fra 2020. Ved at digitalisere kørekortet vil regeringen tage første skridt på vejen mod at gøre relevante ID-beviser digitale.	Visma Consulting A/S og InnoValor Software B.V.
Orkestreringskomponent	Projektet har til formål at etablere en komponent til orkestrering af data på tværs af myndigheder og kommuner, og levere et samlet svar til en portal, i første omgang borger.dk	Ikke valgt endnu

### Status på projekter

2017 (1)	2017 (2)	2018 (1)	2018 (2)	2019 (1)	2019 (2)	Projektnavn	Institution	Fase	Primært formål	Projektudgifter (afvigelse fra baseline)	Projektafslutning (afvigelse fra baseline)	Bruttogevinster (afvigelse fra baseline)	Forventning til realisering af ikke- økonomiske gevinster
●	●	●	●	●	●	HR-projektet	Økonomi- styrelsen	G	K	117,2 mio. kr. (23,8 pct. fordyret)	31-08-2020 (Ingen afvigelse)	170,9 mio. kr. (37,6 pct. forbedret)	Parameter anvendes ikke
●	●	●	●	●	●	Statens budgetsystem	Økonomi- styrelsen	G	K	98,2 mio. kr. (13,2 pct. fordyret)	30-11-2020 (8 mdr. forsinket)	244,7 mio. kr. (81,7 pct. forbedret)	Parameter anvendes ikke
●	●	●	●	●	●	MitID	Digitaliserings- styrelsen	G	K	406,1 mio. kr. (-4,4 pct. reduceret)	17-03-2022 (Ingen afvigelse)	233,8 mio. kr. (Ingen afvigelse)	I meget høj grad
●	●	●	●	●	●	NemLog-in3	Digitaliserings- styrelsen	G	K	261,8 mio. kr. (-18 pct. reduceret)	30-09-2021 (Ingen afvigelse)	261,8 mio. kr. (2.862,9 pct. forbedret)	I høj grad
●	●	●	●	●	●	Næste generation Digital Post	Digitaliserings- styrelsen	G	K	271,6 mio. kr. (-3,7 pct. reduceret)	05-08-2022 (Ingen afvigelse)	318 mio. kr. (-1,3 pct. forværret)	I meget høj grad
●	●	●	●	●	Afs.	Grunddata- programmet	Digitaliserings- styrelsen	R	E	627,2 mio. kr. (-2,1 pct. reduceret)	01-06-2019 (Ingen afvigelse)	8155,3 mio. kr. (3,3 pct. forbedret)	Parameter anvendes ikke
-	-	-	-	-	●	Digitalt Kørekort	Digitaliserings- styrelsen	G	K	48,4 mio. kr. (-0,6 pct. reduceret)	01-07-2021 (Ingen afvigelse)	-59,6 mio. kr. (-2,9 pct. forværret)	I meget høj grad
-	-	-	-	-	●	Orkestrerings- komponent	Digitaliserings- styrelsen	A	K	Fortroligt pga. udbud (ingen afvigelse)	Fortroligt pga. udbud (Ingen afvigelse)	Fortroligt pga. udbud (Ingen afvigelse)	I høj grad

## Forsvarsministeriet

### Projekter

PROJEKTNAMN	BESKRIVELSE	PRIMÆRE LEVERANDØR
Projekt tidsstyring	Formålet med Projekt Tidsstyring og Forsvarsministeriets nye arbejdstidsregistrering for arbejdstid, ferie og friheder er effektivisering. Effektiviseringen skabes primært gennem en større anvendelse af SAP standardløsninger på tværs af koncernen. Effektivisering sker gennem en medarbejder- og lederportal, hvor planlægning, registrering og opfølgning på arbejdstid kan ske gennem en automatisk og direkte dialog mellem chefer og medarbejdere. Anvendelsen af portalløsningen, automatisering af delprocesser samt en øget registreringshyppighed og godkendelse af arbejdstid vil medføre, at rapporteringen vil blive forbedret, og cheferne vil have et mere solidt og aktuelt styringsgrundlag.	IBM

### Status på projekter

2017 (1)	2017 (2)	2018 (1)	2018 (2)	2019 (1)	2019 (2)	Projekt navn	Institution	Fase	Primært formål	Projektudgifter (afvigelse fra baseline)	Projektafslutning (afvigelse fra baseline)	Bruttogevinster (afvigelse fra baseline)	Forventning til realisering af Ikke- økonomiske gevinster
●	●	●	●	●	●	Projekt Tidsstyring	Forsvarsmin isteriets Personale- styrelse	G	E	110,1 mio. kr. (3,8 pct. fordyret)	27-03-2020 (3 mdr. før tid)	0,0 mio. kr. (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke



## Justitsministeriet

### Projekter

PROJEKTNAMN	BESKRIVELSE	PRIMÆRE LEVERANDØR
Domsdatabasen	Projektet er et lovgivningsprojekt, der har til formål at etablere en offentligt tilgængelig database over domme kort tid efter domsafsigelse. Domsdatabasen skal give gratis adgang for private såvel som offentlige myndigheder via en selvbetjeningsløsning, hvor man kan søge på tværs af domstolene i hele landet.	Netcompany A/S
DAM (Digital Asset Management)	Projektet har til formål at tilvejebringe et sammenhængende system til modtagelse, opbevaring, analyse og distribution af multimediefiler. Løsningen skal standardisere og effektivisere politiets arbejde med multimediefiler.	Qvest Media
IAM (Identity Access Management)	Projektet har til formål at øge kvaliteten af Politiets brugerstyring for at sikre compliance i den videre og stigende digitalisering af politiet. Udover at anskaffe et nyt system til brugerhåndtering ønsker politiet også at løfte kvaliteten ved at standardisere jobprofiler, herunder roller og rettigheder til systemerne.	Ikke valgt endnu
POL-DISP	Projektet har til formål at specificere, anskaffe og implementere en national operativ disponeringsplatform til dansk politi, der samler, bearbejder og præsenterer information i et overskueligt situationsoverblik hos landets politikredse samt hos de regionale og nationale situations- og operationscentre.	Ikke valgt endnu
POLPAX	Projektet skal implementere PNRdirektivet (Passenger Name Record), som har til hensigt at styrke politiets muligheder for at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet vha. PNR-data.	Palantir
Nyt Våbenregister	Formålet med projektet er at erstatte det eksisterende våbenregister (PV) og derved sikre overholdelse af kravene beskrevet i EU direktiv2017/853.	Ikke valgt endnu

## Status på projekter

2017 (1)	2017 (2)	2018 (1)	2018 (2)	2019 (1)	2019 (2)	Projekt navn	Institution	Fase	Primært formål	Projektudgifter (afvigelse fra baseline)	Projektafslutning (afvigelse fra baseline)	Bruttogevinster (afvigelse fra baseline)	Forventning til realisering af Ikke- økonomiske gevinster
●	●	●	●	●	●	Domsdatabasen	Domstols- styrelsen	G	L	46,8 mio. kr. (131,3 pct. fordyret)	01-04-2021 (30 mdr. forsinket)	0,0 mio. kr. (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke
-	●	●	●	●	●	DAM	Rigspolitiet	A	K	Fortroligt pga. udbud (59,8 pct. fordyret)	Fortroligt pga. udbud (8 mdr. forsinket)	Fortroligt pga. udbud (-21,4 pct. forværret)	I meget høj grad
-	●	●	●	●	●	IAM	Rigspolitiet	A	K	Fortroligt pga. udbud (Ingen afvigelse)	Fortroligt pga. udbud (12 mdr. forsinket)	Fortroligt pga. udbud (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke
-	-	●	●	●	●	POL-DISP	Rigspolitiet	A	K	Fortroligt pga. udbud (-1,5 pct. reduceret)	Fortroligt pga. udbud (3 mdr. forsinket)	Fortroligt pga. udbud (28,5 pct. forbedret)	I meget høj grad
-	-	-	●	●	●	POLPAX	Rigspolitiet	G	L	47,9 mio. kr. (14,6 pct. fordyret)	01-04-2020 (8 mdr. forsinket)	-146,6 mio. kr. (-5,6 pct. forværret)	Parameter anvendes ikke
					●	Nyt Våbenregister	Rigspolitiet	A	L	Fortroligt pga. udbud (Ingen afvigelse)	Fortroligt pga. udbud (Ingen afvigelse)	Fortroligt pga. udbud (Ingen afvigelse)	I meget høj grad

## Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

### Projekter

PROJEKTNAMN	BESKRIVELSE	PRIMÆRE LEVERANDØR
Udveksling af data om nedgravet infrastruktur (LER)	Projektet har til formål at videreudvikle det eksisterende ledningsejerregister (LER) til en digital infrastruktur for udveksling af standardiserede ledningsoplysninger. Ledningsejerne vil sende standardiserede og digitaliserede oplysninger til LER, som samler og videresender til graveaktørerne, hvilket giver mulighed for automatisering og mere effektive arbejdsgange hos disse og derigennem færre graveskader.	Netcompany A/S
Mustang (tidl. It-understøttelse af afregning og support af VE-ordninger)	Projektet har til formål at understøtte afregning af støtteordninger for vedvarende energi	KMD A/S
SAV (Samling af vandløbsdata)	Projektet skal give forsyningssektoren, myndigheder, erhvervslivet og andre dataanvendere lettere adgang til og bedre mulighed for innovativ anvendelse af data fra det offentlige. Formålet med at samlingen af vandløbsdata er således, at aktuelle data om vandløb skal være let tilgængelige for brugerne for at understøtte øget kvalitet i opgavevaretagelsen i forsyninger, offentlige myndigheder og private virksomheder.	Kortforsyning (SDFE), Danmarks Miljøportal og Obricon
Frie Data	Med baggrund i Regeringens strategi for Danmarks digitale vækst og delstrategi om data som vækstdriver i erhvervslivet skal frisættelse af DMI's meteorologiske data fortsætte bølgen af initiativer, der giver erhvervslivet og andre anvendere lettere adgang og bedre mulighed for innovativ anvendelse af data fra det offentlige.	Intern udvikling på DMI samt leverancer fra Statens IT
Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP - del 1)	Projektets primære formål er etablering af fællesoffentlige geografiske infrastrukturer til sammenstilling og distribution af terræn-, klima- og vanddata, der skal skabe sammenhæng mellem eksisterende data.	Intern udvikling og Netcompany A/S

## Status på projekter

2017 (1)	2017 (2)	2018 (1)	2018 (2)	2019 (1)	2019 (2)	Projekt navn	Institution	Fase	Primært formål	Projektudgifter (afvigelse fra baseline)	Projektafslutning (afvigelse fra baseline)	Bruttogevinster (afvigelse fra baseline)	Forventning til realisering af Ikke- økonomiske gevinster
-	-	●	●	●	●	LER	SDFE <sup>4</sup>	G	E	27,6 mio. kr. (-11,0 pct. reduceret)	31-12-2020 (Ingen afvigelse)	654,1 mio. kr. (4,8 pct. forbedret)	Parameter anvendes ikke
-	-	-	●	●	●	Mustang	Energistyrelsen	G	L	37,5 mio. kr. (Ingen afvigelse)	01-05-2021 (Ingen afvigelse)	20,5 mio. kr. (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke
-	-	-	-	●	●	SAV	SDFE	G	K	11,8 mio. kr. (Ingen afvigelse)	01-07-2020 (Ingen afvigelse)	-6,2 mio. kr. (Ingen afvigelse)	I høj grad
-	-	-	-	●	●	Frie Data	DMI <sup>5</sup>	G	K	16,3 mio. kr. (Ingen afvigelse)	01-04-2020 (Ingen afvigelse)	-16,6 mio. kr. (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke
-	-	-	-	-	●	HIP - del 1	SDFE	G	K	12,3 mio. kr. (Ingen afvigelse)	31-12-2020 (Ingen afvigelse)	-5,1 mio. kr. (Ingen afvigelse)	I høj grad

<sup>4</sup> Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

<sup>5</sup> Danmarks Meteorologiske Institut

## Kulturministeriet

### Projekter

PROJEKTNAMN	BESKRIVELSE	PRIMÆRE LEVERANDØR
SARA (Fælles museums-it)	Projektet er et infrastrukturprojekt til de danske statslige og statsanerkendte museer i form af et nyt fælles informationssystem til registrering og håndtering af samlinger, genstande og kunstværker. Systemet afløser en række forskellige og overvejende ældre databaser.	Axiell ALM
Fælles Biblioteksplatform	Projektet skal skabe en digital infrastruktur for hele uddannelses- og forskningsbibliotekssektoren samt grundlag for, at fælles workflows bidrager til et kvalitetsløft og effektivisering af bibliotekets funktioner og services	Ex Libris

### Status på projekter

2017 (1)	2017 (2)	2018 (1)	2018 (2)	2019 (1)	2019 (2)	Projekt navn	Institution	Fase	Primært formål	Projektudgifter (afvigelse fra baseline)	Projektafslutning (afvigelse fra baseline)	Bruttogevinster (afvigelse fra baseline)	Forventning til realisering af Ikke-økonomiske gevinster
●	●	●	●	●	Afs.	SARA	Slots- og Kulturstyrelsen	R	K	26,0 mio. kr. (-13,1 pct. reduceret)	31-12-2019 (Ingen afvigelse)	34,9 mio. kr. (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke
-	-	●	●	●	Afs.	Fælles Biblioteksplatform	Det Kgl. Bibliotek	R	K	24,9 mio. kr. (12,6 pct. fordyret)	19-11-2019 (1,6 mdr. forsinket)	31,7 mio. kr. (11,2 pct. forbedret)	Parameter anvendes ikke

## Miljø- og Fødevareministeriet

### Projekter

PROJEKTNAMN	BESKRIVELSE	PRIMÆRE LEVERANDØR
VanDa	Projektet har til formål til dels at erstatte en række forældede systemer og databaser med nyt fælles fagsystem, dels at forbedre datagrundlaget på overfladevandsområdet på tværs af myndigheder og sikre offentlig adgang til disse data via fælles offentlige datastandarder og begrebsmodeller.	Globeteam
Elektronisk certificering (DIX)	I dag udfylder og printer eksportørerne selv certifikaterne, som inden eksporten forelægges Fødevarestyrelsen til udstedelse. Selve udstedelsen sker med baggrund i Fødevarestyrelsens kontrol med eksportørens overholdelse af tredjelandskrav. Erhvervet har derfor fremført ønsket om et digitalt system til eksportcertifikater ud fra en forventning om, at et digitalt system kan adressere flere af disse udfordringer. DIX systemet skal være udformet således, at det senere vil være muligt at erstatte papircertifikater og i stedet udstede reelle elektroniske certifikater direkte til tredjelændene.	IBM
IT-understøttelse af Monitorering	Projektets formål er at indføre et nyt kontrolparadigme, hvor den fysiske kontrol af udvalgte arealbaserede landbrugsstøtteordninger erstattes af monitorering baseret på satellitbilleder. Kontrollen ønskes samtidig ændret fra at være en detaljeorienteret kontrol af 5 pct. af ansøgerne, til at være en 100 pct. kontrol med fokus på større og systematiske overtrædelser.	DHI GRAS
Arter.dk (Tidl. Artsportalen)	Formålet med Artsportalen er at øge den almene viden om arterne i Danmarks natur til gavn for hele befolkningen og med henblik på både en mere målrettet naturforvaltning med adgang til viden på et mere kvalitativt grundlag og forskning. Ved at samle alle data om artsforekomst i Danmark og give mulighed for at alle kan indmelde artsregistreringer bidrager projektet med et mærkbart kvalitetsløft til den fælles viden om dansk natur både nationalt og internationalt.	Globeteam
Ny kundeportal	Den nye kundeportal skal gøre kommunikationen mellem kunder og LBST mere tydelig og intuitiv og skal over tid erstatte de forskelligartede løsninger, som stilles til rådighed i dag. Med projektet har Landbrugsstyrelsen følgende overordnede formål: At gøre det nemt, enkelt og til tiden for landmændene, at reducere antallet af kundeinteraktioner og omkostningen per interaktion og brugeroplevelsen skal være bedre og give tryghed for brugerne	CGI
VetStat	Overordnet set er formålet med projektet, at VetStat skal fremtidssikres IT-teknisk, så systemet fortsat kan være det solide grundlag for den detaljerede registrering af receptpligtige lægemidler til dyr, som det er i dag. Samtidigt skal der ske en vis grad af videreudvikling og modernisering.	CGI

Grundmodel 4	Hensigten med projektet er at give grundmodellen et kvalitetsløft og at nedbringe tiden til IT-opsætning af projektstøtteordninger og at effektivisere sagsbehandlingen. Den nye grundmodel skal sikre en hurtigere og mere automatiseret sagsbehandling og etablere en teknisk tidssvarende grundmodel, som muliggør en hurtigere opsætning og test af nye projektstøtteordninger.	N/A
CAP2020	Projektet er en del af styrelsens overordnede reform-projekt "CAP post 2020 – politik og administration", hvis formål er at sikre, at Danmark har en faglig og politisk velfunderet forhandlingsposition i de løbende forhandlinger af EU's landbrugsreform. Endvidere er dette projekt tæt forbundet med projektet "Udarbejdelse af strategisk plan for CAP 2021-2027 (CAP-Plan)", hvis formål er at levere en national plan for implementering af CAP2020.	CGI, Formpipe og COWI

### Status på projekter

2017 (1)	2017 (2)	2018 (1)	2018 (2)	2019 (1)	2019 (2)	Projektnavn	Institution	Fase	Primært formål	Projektudgifter (afvigelse fra baseline)	Projektafslutning (afvigelse fra baseline)	Bruttogevinster (afvigelse fra baseline)	Forventning til realisering af Ikke-økonomiske gevinster
●	●	●	●	●	●	Vanda	Miljøportalen	G	K	50,9 mio. kr. (0,2 pct. fordyret)	01-01-2021 (Ingen afvigelse)	-15,4 mio. kr. (3,9 pct. forbedret)	I høj grad
-	-	●	●	●	●	DIX	Fødevarer- styrelsen	G	E	25,8 mio. kr. (Ingen afvigelse)	10-08-2020 (4,33 mdr. forsinket)	37,8 mio. kr. (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke
-	-	-	●	●	●	IT- understøttelse af Monitorering	Landbrugs- styrelsen	G	E	21,1 mio. kr. (Ingen afvigelse)	30-04-2020 (Ingen afvigelse)	37,3 mio. kr. (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke
-	-	-	-	●	●	Arter.dk	Miljøportalen	G	K	27,4 mio. kr. (Ingen afvigelse)	01-01-2021 (Ingen afvigelse)	-9,8 mio. kr. (Ingen afvigelse)	I høj grad
-	-	-	-	●	●	Ny kundeportal	Landbrugs- styrelsen	G	K	13,9 mio. kr. (Ingen afvigelse)	01-06-2020 (1 mdr. forsinket)	24,5 mio. kr. (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke
-	-	-	-	●	●	VetStat	Fødevarer- styrelsen	G	K	31,5 mio. kr. (0,6 pct. fordyret)	20-11-2020 (Ingen afvigelse)	33,7 mio. kr. (Ingen afvigelse)	I høj grad
-	-	-	-	●	Afs.	Grundmodel 4	Landbrugs- styrelsen	R	E	26,4 mio. kr. (Ingen afvigelse)	06-12-2019 (Ingen afvigelse)	42,5 mio. kr. (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke
-	-	-	-	-	●	CAP2020	Landbrugs- styrelsen	G	L	69,5 mio. kr. (Ingen afvigelse)	01-01-2022 (Ingen afvigelse)	0,0 mio. kr. (Ingen afvigelse)	I meget høj grad

## Skatteministeriet

### Projekter

PROJEKTNAMN	BESKRIVELSE	PRIMÆRE LEVERANDØR
Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI)	Formålet for ICI er at tilvejebringe en midlertidig it-understøttelse til inddrivelsesområdet i SKAT, såvel som en langsigtet løsning til ibrugtagning i 2019. Hertil skal ICI understøtte nedlukningen af EFI/DMI i samarbejde med SKAT Inddrivelse, understøtte datavask af fordringer samt bidrage til at forenkle inddrivelseslovgivningen. ICI organiseres i en programstruktur og er under opbygning i Skatteministeriets departement på baggrund af erfaringerne fra Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE).	Netcompany A/S, Visma og CGI
DUPLA (tidl. GUL)	Projektets mål er, at etablere en generel dataudstillingsløsning i SKAT til en række forskellige lovhjemlede formål, der på tværs af sagsbehandlingssituationer håndhæver logning, adgangsstyring, aftalestyring og datafiltrering.	Nine A/S
Projekt deleøkonomi	Projektets formål er at garantere efterlevelse af loven ved at sikre mulighed for tredjeparts-indberetninger for indberetningspligtige deleøkonomiske platforme for områderne bil, båd og bolig. Derudover skal projektet sikre, at indberetningerne indgår i den årlige skatteberegning, at de udstilles internt til kontrolformål, og at de udstilles til andre myndigheder og dermed kan danne grundlag for afgørelsessager.	Nine, 7N og DXC
Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE)	ICE er i oktober 2014 etableret som en særskilt organisation i Skatteministeriets departement og har til formål at udvikle og implementere et nyt ejendomsvurderingssystem bl.a. med udgangspunkt i anbefalingerne fra Engbergudvalget.	Netcompany A/S, Visma og Deloitte UK
Implementeringscenter for Told (DMS)	For at implementere EUTK vil projektet anskaffe en Declaration Management Solution (DMS) med understøttelse af import, der på sigt ligeledes skal understøtte funktionaliteten for eksport og EU-forsendelse	Ikke valgt endnu
Implementeringscenter for Told (KRS)	KRS-projektet har til formål at implementere den samlede it-løsning, som skal imødekomme kravene fra EU's nye toldkodeks EUTK. KRS-projektets centrale omdrejningspunkt er dermed implementering af EUTK's regulering af risiko- og kontrolstyring samt dataanvendelse.	Ikke valgt endnu
One Stop Moms 2 (OSM2)	Formålet med projektet er, at Skatteforvaltningen opnår fuld lovmedholdelighed med den nye EU-lovgivning omkring salg af varer og ydelser til private forbrugere i EU. Projektet vil derfor udvikle og implementere processerne og systemunderstøttelsen, der er nødvendige for det.	Visma Consulting A/S



## Status på projekter

2017 (1)	2017 (2)	2018 (1)	2018 (2)	2019 (1)	2019 (2)	Projektnavn	Institution	Fase	Primært formål	Projektudgifter (afvigelse fra baseline)	Projektafslutning (afvigelse fra baseline)	Bruttogevinster (afvigelse fra baseline)	Forventning til realisering af ikke- økonomiske gevinster
●	●	●	●	●	●	ICI	UFST <sup>6</sup>	G	N/A	Fortroligt (Ingen afvigelse)	Fortroligt (3 mdr. forsinket)	Fortroligt (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke
-	●	●	●	●	●	DUPLA	UFST	G	K	30,8 mio. kr. (13,5 pct. fordyret)	30-04-2020 (2 mdr. før tid)	182,8 mio. kr. (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke
-	-	-	-	●	●	Projekt deleøkonomi	UFST	G	L	47,4 mio. kr. (-4,1 pct. reduceret)	30-09-2020 (Ingen afvigelse)	-151,9 mio. kr. (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke
-	-	-	-	●	●	ICE	UFST	G	L	Fortroligt (Ingen afvigelse)	Fortroligt (Ingen afvigelse)	Fortroligt (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke
-	-	-	-	-	●	ICT-DMS	Toldstyrelsen & UFST	A	L	Fortroligt pga. udbud	Fortroligt pga. udbud	Fortroligt pga. udbud	I høj grad
-	-	-	-	-	●	ICT-KRS	Toldstyrelsen & UFST	A	L	Fortroligt pga. udbud	Fortroligt pga. udbud	Fortroligt pga. udbud	I høj grad
-	-	-	-	-	●	OSM2	Skattestyrelsen & UFST	G	L	Fortroligt (-1,0 pct. reduceret)	Fortroligt (Ingen afvigelse)	Fortroligt (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke

<sup>6</sup> Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

## Sundheds- og Ældreministeriet

### Projekter

PROJEKTNAMN	BESKRIVELSE	PRIMÆRE LEVERANDØR
Fælles Pilotafprøvning	Projektet skal afprøve leverancerne fra udviklingsprojekterne i programmet og skabe et robust grundlag for udbredelse af programmets løsninger i hele sundhedsdomænet.	Ingen leverandør
LEOPARD	Projektets formål er at modernisere det danske lægemiddelregister på en ny standardplatform, så det bliver compliant med krav i den europæiske lægemiddelregulering med ikrafttræden i 2019 og samtidig mere robust og agilt. Moderniseringen består i en skarpt scopet og tilsvarende hurtigt leveret LEOPARD.	Netcompany A/S
LEMUR (tidl. Prisloftprojekt)	Der er tre overordnede formål med etableringen af prisloftsystemet LEMUR: 1) At sikre, at listepriiserne på medicin i Danmark ligger på niveau med sammenlignelige europæiske listepriiser på baggrund af en international benchmarking. 2) At sikre større forudsigelighed i medicinudgifterne, og at der ikke kan indføres pludselige høje prisstigninger på lægemidler ud over det fastsatte prisloft (fx pga. en ændret konkurrencesituation). 3) At sikre, at alle virksomheder, der forhandler lægemidler i Danmark er omfattet af et prisloft i den ene eller anden version og at ingen tilskudsberettigede, receptpligtige eller sygehusforbeholdte lægemidler dermed er uden en form for prisregulering.	Netcompany A/S

### Status på projekter










2017 (1)	2017 (2)	2018 (1)	2018 (2)	2019 (1)	2019 (2)	Projekt navn	Institution	Fase	Primært formål	Projektudgifter (afvigelse fra baseline)	Projektafslutning (afvigelse fra baseline)	Bruttogevinster (afvigelse fra baseline)	Forventning til realisering af Ikke-økonomiske gevinster
-	-	-				Fælles Pilotafprøvning	Sundhedsdata-styrelsen	G	K	17,0 mio. kr. (15,2 pct. fordyret)	01-04-2020 (6 mdr. forsinket)	0 mio. kr. (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke
-	-	-				LEOPARD	Lægemiddel-styrelsen	G	K	48,7 mio. kr. (Ingen afvigelse)	01-06-2020 (Ingen afvigelse)	13,5 mio. kr. (1,5 pct. forbedret)	Parameter anvendes ikke
-	-	-	-			LEMUR	Lægemiddel-styrelsen	G	L	18,4 mio. kr. (-14,2 pct. reduceret)	01-07-2020 (6 mdr. forsinket)	331 mio. kr. (-16,7 pct. forværret)	Parameter anvendes ikke

## Transport- og Boligministeriet

### Projekter

PROJEKTNAMN	BESKRIVELSE	PRIMÆRE LEVERANDØR
Atrium FM	Atrium FM-projektet har til formål at levere it-understøttelse til BYGSTs FM-projekt.	KMD
Asset Management	Projektet har til formål at anskaffe et nyt system til asset management for den kapitalbevarende vedligehold.	Ikke valgt endnu

### Status på projekter

2017 (1)	2017 (2)	2018 (1)	2018 (2)	2019 (1)	2019 (2)	Projekt navn	Institution	Fase	Primært formål	Projektudgifter (afvigelse fra baseline)	Projektafslutning (afvigelse fra baseline)	Bruttogevinster (afvigelse fra baseline)	Forventning til realisering af ikke- økonomiske gevinster
					Afs.	Atrium FM	Bygnings- styrelsen	R	K	12,2 mio. kr. (-16,1 pct. reduceret)	01-10-2019 (Ingen afvigelse)	-5,9 mio. kr. (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke
-	-					Asset Management	Vej- direktoratet	A	E	Fortroligt pga. udbud (Ingen afvigelse)	Fortroligt pga. udbud (17 mdr. forsinket)	Fortroligt pga. udbud (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke

## Uddannelses- og Forskningsministeriet

### Projekter

PROJEKTNAMN	BESKRIVELSE	PRIMÆRE LEVERANDØR
Krav og Udbetaling	Projektets formål er at sikre overholdelse af juridiske retningslinjer for modregning i SU stipendier, overholdelse af SKAT's myndighedskrav samt en øget automatisering af rejsning og frafald af krav om tilbagebetaling af SU.	Der udvikles in house
ESAS (tidl. Nyt SIS)	Med ESAS stilles et nyt studieadministrativt system til rådighed for studieadministrationen på professionshøjskolerne, erhvervsakademierne og de omfattede maritime uddannelsesinstitutioner. Systemet udgør en del af den samlede it-understøttelse af det studieadministrative område. Funktionaliteten i det nye system vil dække de studieadministrative kerneopgaver og arbejdsprocesser, som institutionerne er pålagt som følge af nationale regler og lovgivning.	Netcompany A/S

### Status på projekter

2017 (1)	2017 (2)	2018 (1)	2018 (2)	2019 (1)	2019 (2)	Projekt navn	Institution	Fase	Primært formål	Projektudgifter (afvigelse fra baseline)	Projektafslutning (afvigelse fra baseline)	Bruttogevinster (afvigelse fra baseline)	Forventning til realisering af Ikke- økonomiske gevinster
-	-	●	●	●	Afs.	Krav og Udbetaling	SIU <sup>7</sup>	R	L	29,9 mio. kr. (-18,6 pct. reduceret)	01-11-2019 (4 mdr. forsinket)	5,9 mio. kr. (Ingen afvigelse)	Parameter anvendes ikke
-	-	-	●	●	●	ESAS	SIU	G	E	180,5 mio. kr. (-0,8 pct. reduceret)	01-12-2021 (9 mdr. forsinket)	334,3 mio. kr. (50 pct. forbedret)	Parameter anvendes ikke

<sup>7</sup> Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

## Udlændinge og Integrationsministeriet

### Projekter

PROJEKTNAMN	BESKRIVELSE	PRIMÆRE LEVERANDØR
Ny ESDH-løsning	Projektets primære formål er modernisering, hvor implementering af en ny ESDH løsning vil understøtte en mere stabil og fleksibel sagsbehandling på tværs af Udlændingesagskæden.	Tieto
Øget brug af biometri til fastlæggelse af udlændinges identitet	Det primære formål er opfyldelse af Lov nr. 703 (Lovforslag L188) og Finansloven for 2018. Forretningsbehovene i L188 skal it-understøttes af projektet. Midlerne til it-understøttelsen er fastlagt i FL18 og har til formål at forebygge snyd med offentlige ydelser og føre bedre kontrol med udlændinge i Danmark.	Ikke valgt endnu

### Status på projekter

2017 (1)	2017 (2)	2018 (1)	2018 (2)	2019 (1)	2019 (2)	Projekt- navn	Institution	Fase	Primært formål	Projektudgifter (afvigelse fra baseline)	Projektafslutning (afvigelse fra baseline)	Bruttogevinster (afvigelse fra baseline)	Forventning til realisering af Ikke- økonomiske gevinster
-	-	●	●	●	Afs.	Ny ESDH-løsning	UIM <sup>8</sup>	R	K	49,2 mio. kr. (15,5 pct. fordyret)	23-01-2020 (5,7 mdr. forsinket)	60,4 mio. kr. (6,0 pct. forbedret)	Parameter anvendes ikke
-	-	-	-	●	●	Biometri	UIM	A	L	Fortroligt pga. udbud (Ingen afvigelse)	Fortroligt pga. udbud (Ingen afvigelse)	Fortroligt pga. udbud (Ingen afvigelse)	I nogen grad

<sup>8</sup> Udlændinge- og Integrationsministeriet

Mere information om Statens It-råd,  
projekt- og systemstyring kan findes på  
[digst.dk/styring](https://digst.dk/styring)

STATENS IT-RÅD  
STATUSRAPPORT 2019  
Maj 2020

Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen

ISBN 978-87-93073-30-2 (web)
